

Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin**Sondierungen: BS 1 - BS 8, BS 10 - BS 22 mit DPH 1 - DPH 4**

Ort: Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin

Zweck: Altlastenuntersuchung - Wasserhaltung / Grundwasserabsenkung

Rechts: - mE Hoch: - mN

Höhe des Ansatzpunktes: - m ü. NHN

Bemerkungen / Lageskizze:



Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG

Fachaufsicht: Dipl.-Geol. U. Martin, Dipl.-Geol. T h. Biener, Dipl.-Geo gr. M. Fritzsche

Bohrunternehmen: AnalyTech GmbH Mittenwalde

sondiert am: 03.03.2026


Sonstige Angaben: _____

Datum: _____ Firmenstempel: _____ Unterschrift: _____

Name des Unternehmens: AnalyTech GmbH Mittenwalde Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 1 von 1 Aufschluss: BS 1 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,10	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach grobsandig, schwach humos bis humos, schwach schluffig - Aufschüttung, Mutterboden Wurzeln - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarz kalkfrei	erdfeucht	sehr leicht zu bohren	bgp Pr. 1.1 0,00 - 0,10	
0,70	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach humos Fremdbestandteil (FB) < 10 % - Aufschüttung vereinzelt Ziegelbruchstücke - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [SE]	grau bis graubraun kalkfrei bis kalkhaltig	erdfeucht bis schwach feucht	sehr leicht zu bohren bis 'leicht zu bohren	bgp Pr. 1.2 0,10 - 0,70	
3,00	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	beige bis hellbraun kalkfrei	schwach feucht	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 1.3 0,70 - 2,00 bgp Pr. 1.4 2,00 - 3,00	

m u. GOK (39,64 m ü. NHN)

BS 1

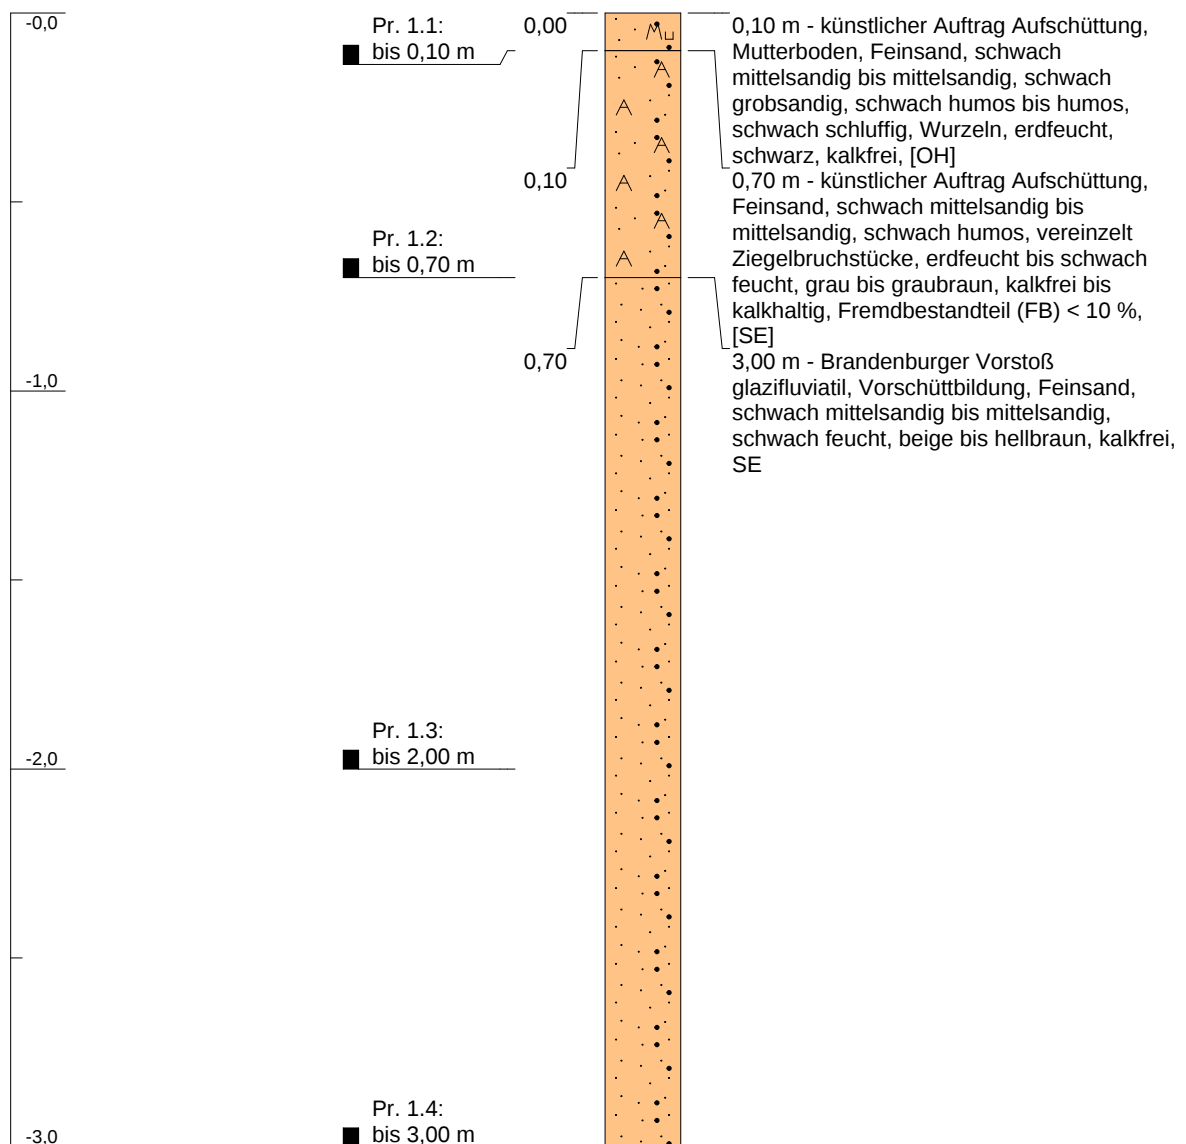

Blatt 1 von 1

Höhenmaßstab: 1:20

Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin			
Bohrung: BS 1			
Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG		Ostwert: 379495 mE	
Bohrfirma: AnalyTech GmbH Mittenwalde		Nordwert: 5786270 mN	
Bearbeiter: Frau Giese		Ansatzhöhe: 39,64 m ü. NHN	
Datum: 24.03.2026	Anlage 2	Endtiefe: 3,0 m u. Ansatz	




AnalyTech
BERLIN-BRANDENBURG

Name des Unternehmens: AnalyTech GmbH Mittenwalde Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 		Seite: 1 von 1	
					Aufschluss: BS 2	
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin		Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalkgehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
1,30	Feinsand, Schlacke-Kohlengrus-Gemisch, schwach grobsandig, schwach feinkiesig, schluffig Fremdbestandteil (FB) < 50 % - Aufschüttung Schlacke, Kohlengrus - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarz bis schwarzgrau kalkhaltig	erdfeucht bis feucht	leicht zu bohren	bgp Pr. 2.1 0,00 - 1,30	
1,90	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach humos bis humos - Aufschüttung - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	grau bis dunkelgrau kalkfrei	schwach feucht bis feucht	leicht zu bohren bis 'mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 2.2 1,30 - 1,90	
3,00	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	beige bis hellbraun kalkfrei	schwach feucht bis feucht	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 2.3 1,90 - 3,00	

m u. GOK (39,85 m ü. NHN)

BS 2

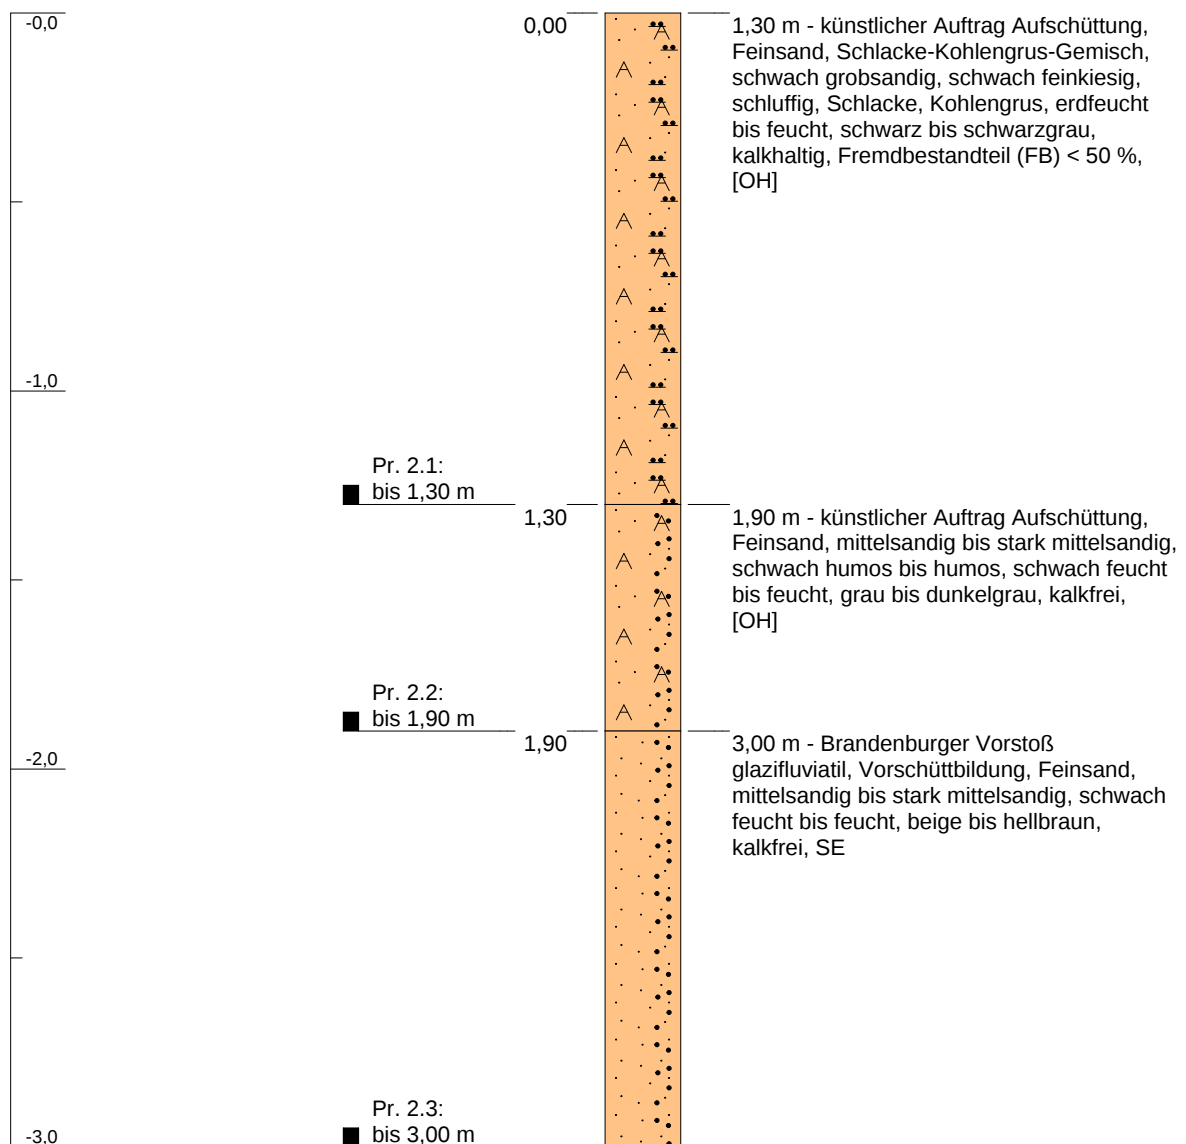

Blatt 1 von 1

Höhenmaßstab: 1:20


Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin			
Bohrung: BS 2			
Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG		Ostwert: 379487 mE	
Bohrfirma: AnalyTech GmbH Mittenwalde		Nordwert: 5786274 mN	
Bearbeiter: Frau Giese		Ansatzhöhe: 39,85 m ü. NHN	
Datum: 24.03.2026	Anlage 2	Endtiefe: 3,0 m u. Ansatz	

**AnalyTech**
BERLIN-BRANDENBURG

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 1 von 1 Aufschluss: BS 3 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,90	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach humos bis schwach humos, schwach schluffig Schlacke, Wurzeln bis Pflanzenreste - Aufschüttung, Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarzgrün bis dunkelbraun kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	sehr leicht zu bohren bis 'leicht zu bohren	bgp Pr. 3.1 0,00 - 0,90	Fremdbestandteil (FB) < 10 %
2,30	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig bis schluffig Kiesel - Grundmoräne, Geschiebesand - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU (Sand, schluffig)-SU* (Sand, stark schluffig)	braun kalkfrei	erdfeucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 3.2 0,90 - 2,30	
3,00	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach grobsandig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	beige bis hellbraun kalkfrei	schwach feucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 3.3 2,30 - 3,00	

m u. GOK (41,07 m ü. NHN)

BS 3

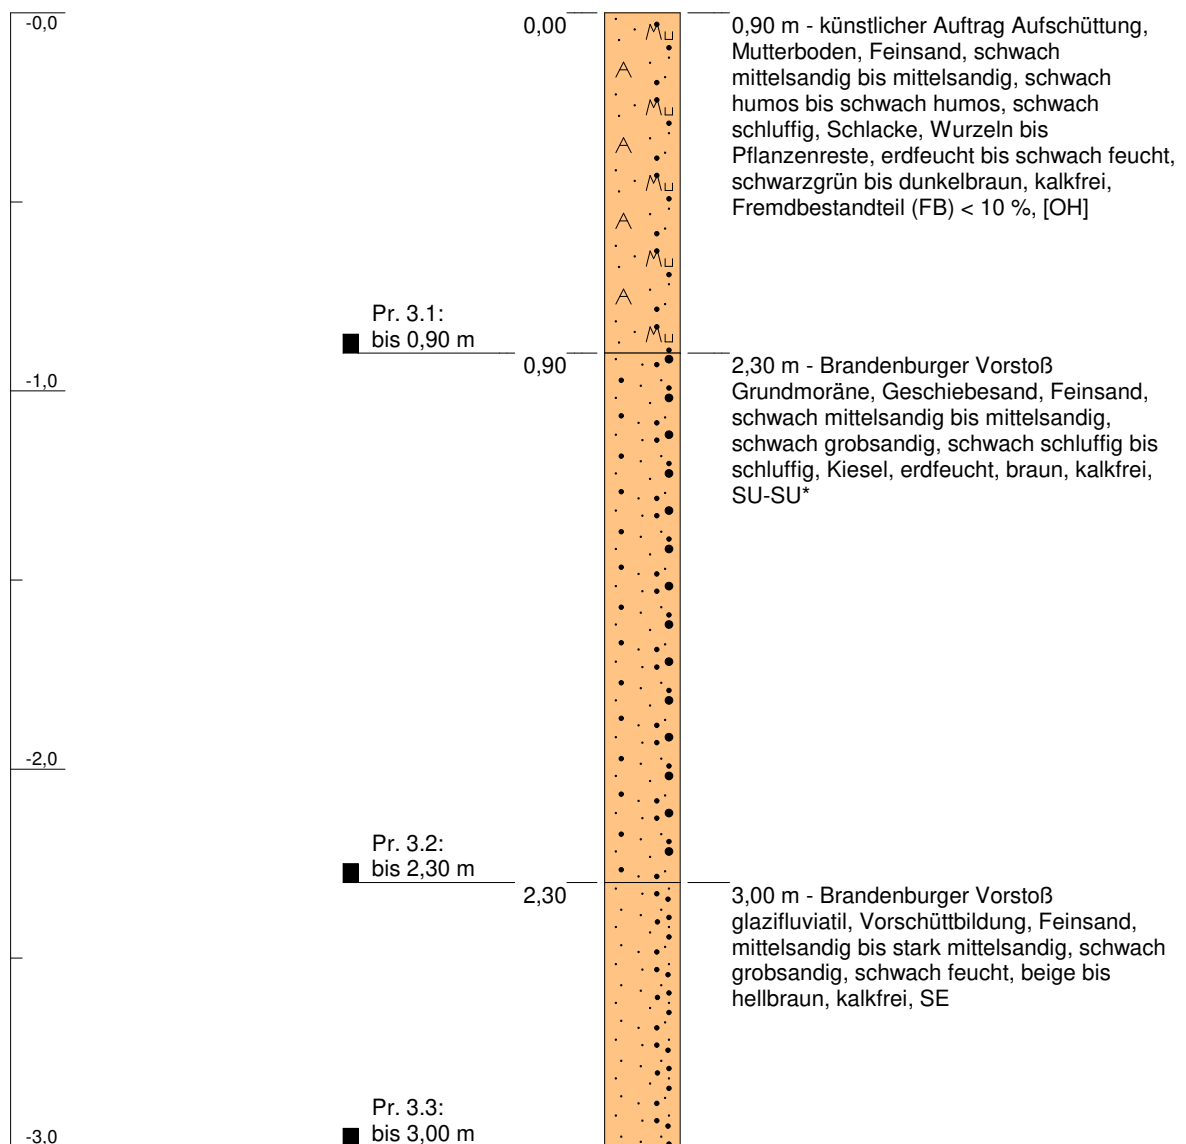

Höhenmaßstab: 1:20

Blatt 1 von 1

Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin			
Bohrung: BS 3			
Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG		Ostwert: 379514 mE	
Bohrfirma: AnalyTech GmbH Mittenwalde		Nordwert: 5786202 mN	
Bearbeiter: Frau Giese		Ansatzhöhe: 41,07 m ü. NHN	
Datum: 24.03.2026	Anlage 2	Endtiefe: 3,0 m u. Ansatz	




AnalyTech
BERLIN-BRANDENBURG

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 1 von 1 Aufschluss: BS 4 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,70	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig, schwach humos bis humos Kiesel, vereinzelt Wurzeln - Aufschüttung, Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarz bis schwarzgrau kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	leicht zu bohren bis 'mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 4.1 0,00 - 0,70	
2,40	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig bis schluffig Kiesel - Grundmoräne, Geschiebesand - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU (Sand, schluffig)-SU* (Sand, stark schluffig)	hellbraun bis braun, graubraun kalkfrei	erdfeucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 4.2 0,70 - 2,40	
3,00	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach grobsandig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	beige bis hellbraun kalkfrei	schwach feucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 4.3 2,40 - 3,00	

m u. GOK (41,13 m ü. NHN)

BS 4

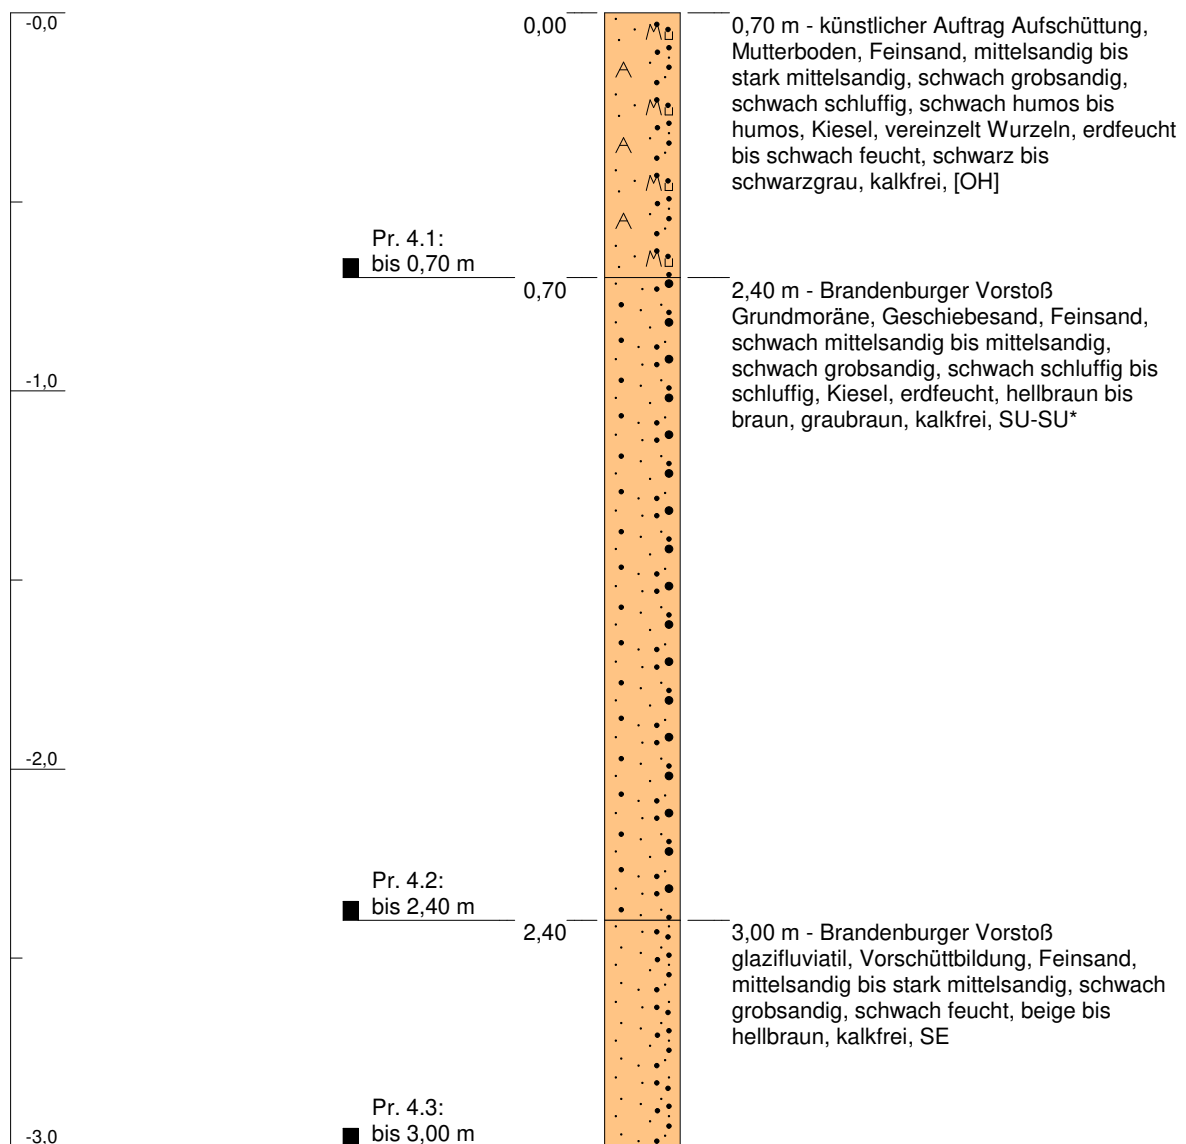

Höhenmaßstab: 1:20

Blatt 1 von 1


Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin			
Bohrung: BS 4			
Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG		Ostwert: 379521 mE	
Bohrfirma: AnalyTech GmbH Mittenwalde		Nordwert: 5786196 mN	
Bearbeiter: Frau Giese		Ansatzhöhe: 41,13 m ü. NHN	
Datum: 24.03.2026	Anlage 2	Endtiefe: 3,0 m u. Ansatz	

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 		Seite: 1 von 2 Aufschluss: BS 5 / DPH 1 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25	
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,10	Grasnarbe / Krautschicht Wurzeln - Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarz kalkfrei		sehr leicht zu bohren		
0,90	Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, humos Wurzeln, vereinzelt Kiesel, vereinzelt Ziegelbruchstücke - Aufschüttung - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	dunkelbraun kalkfrei	schwach feucht, locker gelagert bis mitteldicht gelagert	leicht zu bohren bis 'mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 5.1 0,10 - 0,90	Fremdbestandanteil FB < 10 %
2,60	Geschiebelehm, Schluff, stark mittelsandig, grobsandig, schwach feinsandig, schwach tonig Kiesel - glaziär - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU* (Sand, stark schluffig)-UL (Schluff, leicht plastisch)	braun kalkfrei	steif bis halbfest, feucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 5.2 0,90 - 2,00 bgp Pr. 5.3 2,00 - 2,60	

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 2 von 2 Aufschluss: BS 5 / DPH 1 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
4,30	Grobsand, feinkiesig, schwach mittelsandig, schwach feinsandig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SI (Sand, intermittierend)	braun kalkfrei	schwach feucht bis feucht, mitteldicht gelagert	leicht zu bohren bis 'mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 5.4 2,60 - 4,30	Grundwasserspiegel (4,30)
6,20	Grobsand, feinkiesig, schwach mittelsandig, schwach feinsandig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SI (Sand, intermittierend)	braun kalkfrei	nass, mitteldicht gelagert	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 5.5 4,30 - 5,00 bgp Pr. 5.6 5,00 - 6,20	
8,00	Feinsand bis Mittelsand, schwach grobsandig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	grau kalkfrei	nass, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 5.7 6,20 - 7,00 bgp Pr. 5.8 7,00 - 8,00	

BS 5 / DPH 1

m u. GOK (40,07 m ü. NHN)

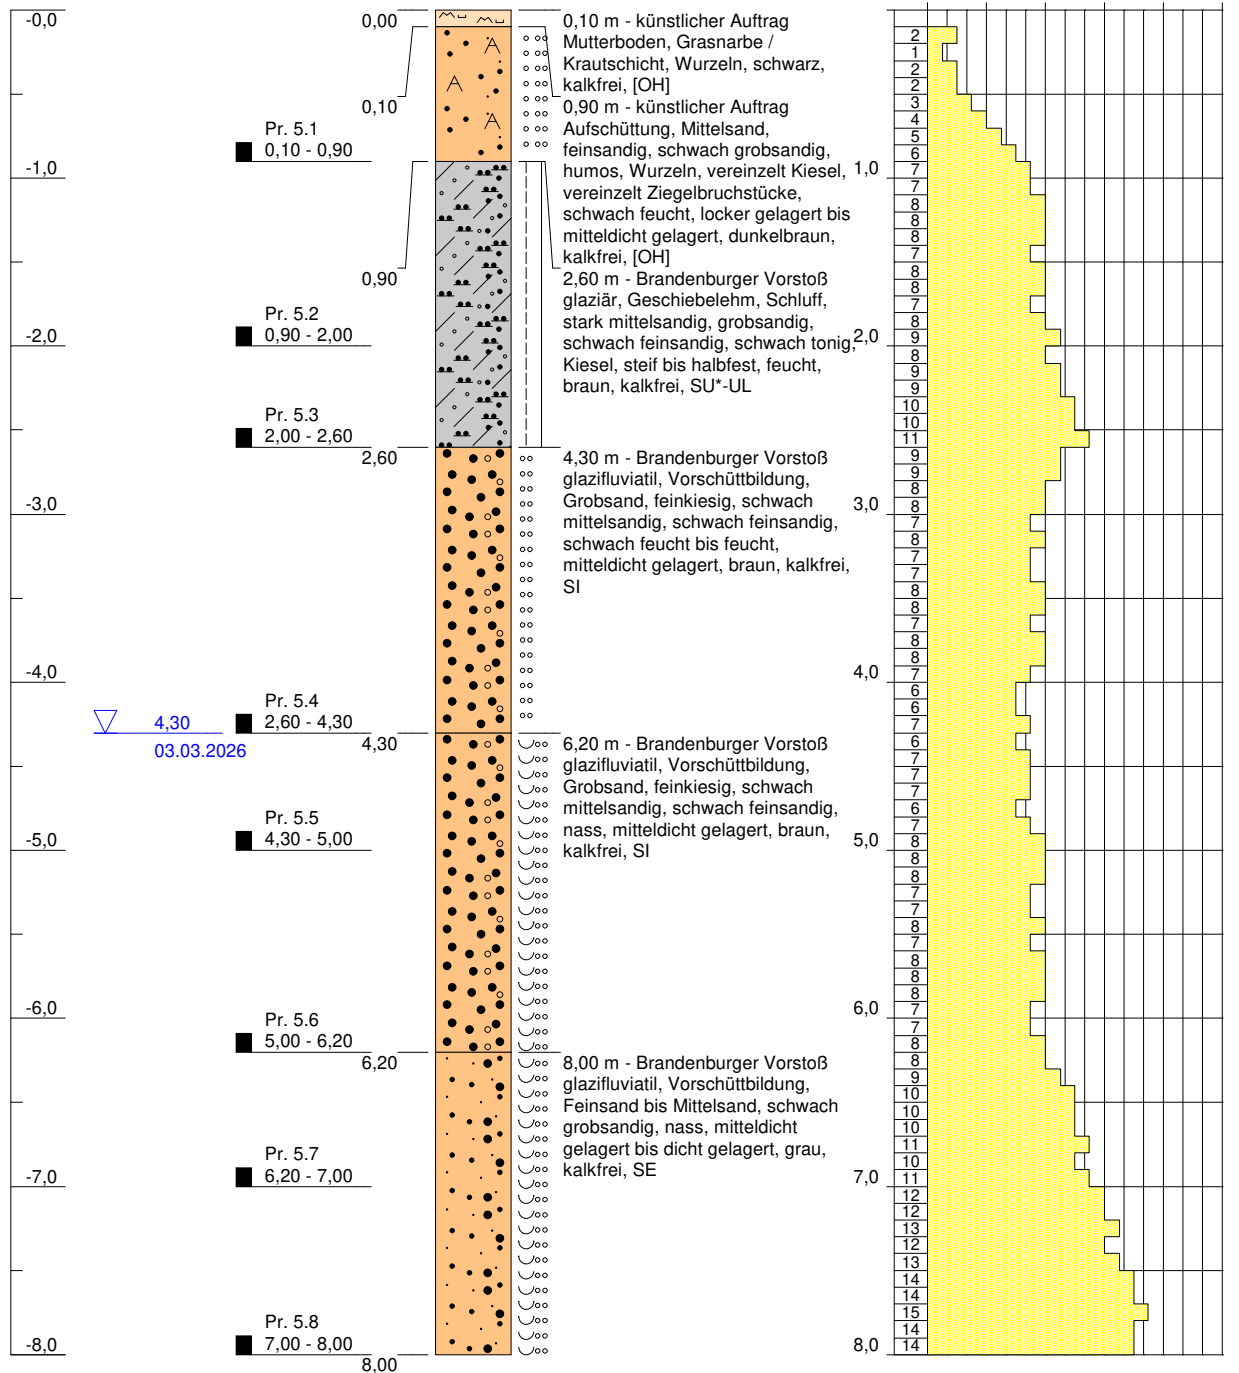

Höhenmaßstab: 1:45


Blatt 1 von 1

Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin				
Bohrung: BS 5 / DPH 1				
Auftraggeber:	Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG		Ostwert:	379472,29 mE
Bohrfirma:	AnalyTech GmbH Mittenwalde		Nordwert:	5786195,03 mN
Bearbeiter:	Frau Giese		Ansatzhöhe:	40,07 m ü. NHN
Datum:	24.03.2026		Endtiefe:	8,0 m u. Ansatz

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 1 von 1 Aufschluss: BS 6 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,10	Grasnarbe / Krautschicht Wurzeln - Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarz kalkfrei		sehr leicht zu bohren		
0,70	Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach humos bis humos Wurzeln, vereinzelt Kiesel, vereinzelt Ziegelbruchstücke - Aufschüttung - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	braun bis dunkelbraun kalkfrei	schwach feucht	leicht zu bohren bis 'mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 6.1 0,10 - 0,70	Fremdbestandanteil FB < 10 %
1,60	Grobsand, mittelsandig, schwach feinsandig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	braun kalkfrei	schwach feucht bis feucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 6.2 0,70 - 1,60	
3,00	Feinsand, schluffig bis stark schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig vereinzelt Kiesel - Grundmoräne, Geschiebesand - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU (Sand, schluffig)-SU* (Sand, stark schluffig)	hellbraun bis braun kalkfrei	schwach feucht bis feucht	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 6.3 1,60 - 3,00	

m u. GOK (40,15 m ü. NHN)

BS 6

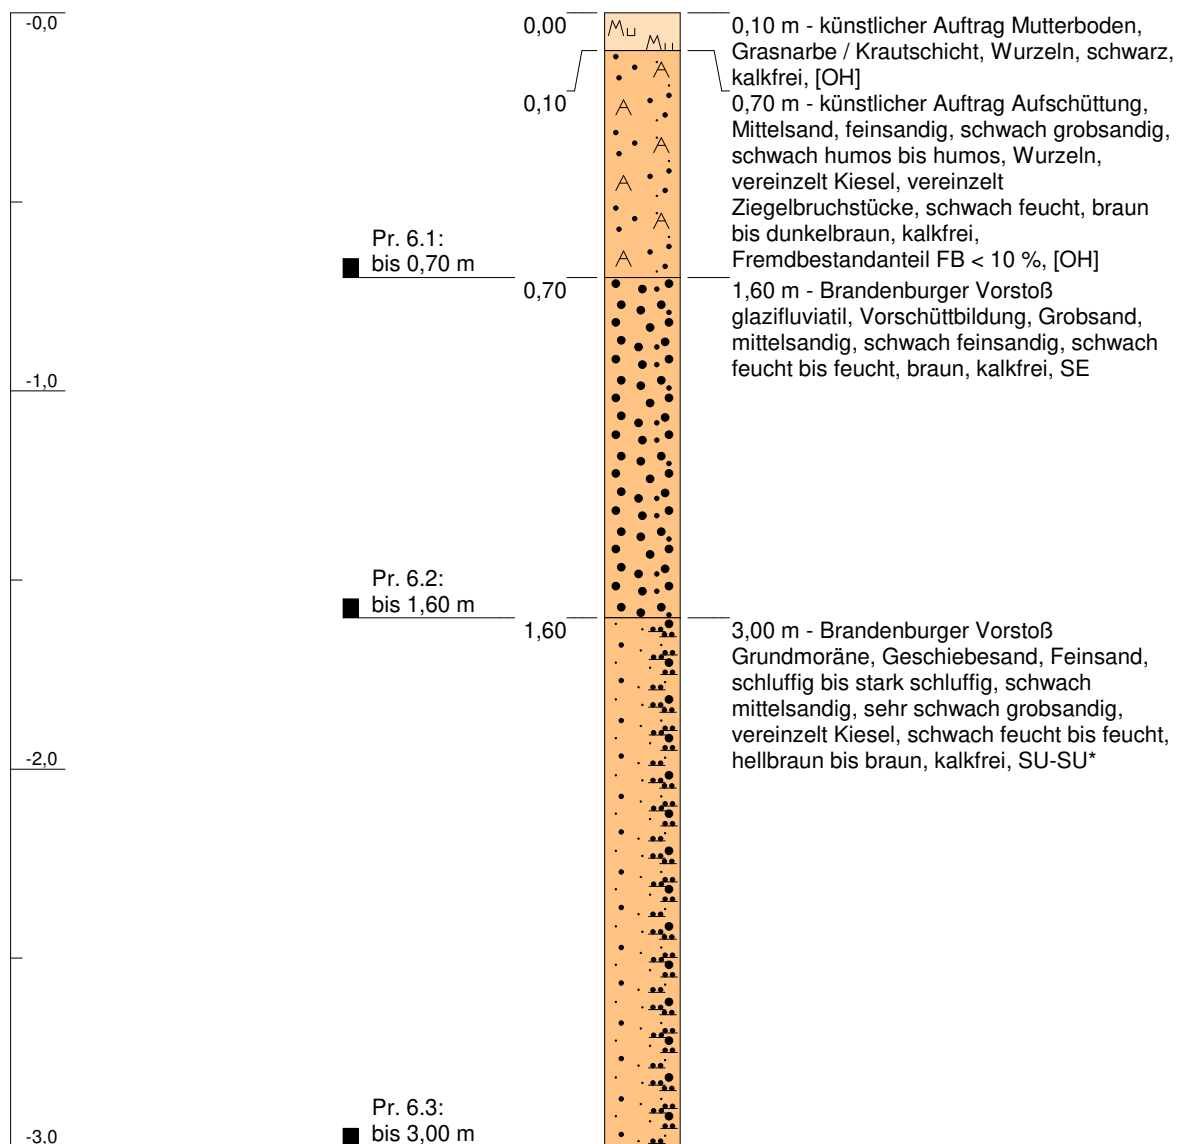

Höhenmaßstab: 1:20

Blatt 1 von 1

Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin			
Bohrung: BS 6			
Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG		Ostwert: 379479 mE	
Bohrfirma: AnalyTech GmbH Mittenwalde		Nordwert: 5786187 mN	
Bearbeiter: Frau Giese		Ansatzhöhe: 40,15 m ü. NHN	
Datum: 24.03.2026		Anlage 2	Endtiefe: 3,0 m u. Ansatz




Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 1 von 2 Aufschluss: BS 7 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,20	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach humos bis humos, schwach schluffig Wurzeln - Aufschüttung, Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarz bis schwarzgrau kalkfrei	erdfeucht bis feucht	sehr leicht zu bohren bis 'leicht zu bohren	bgp Pr. 7.1 0,00 - 0,20	
1,30	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig, vereinzelt humos - Aufschüttung - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [SU], [OH]	braungrau bis grau kalkfrei	schwach feucht	leicht zu bohren bis 'mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 7.2 0,20 - 1,30	
1,70	Feinsand, mittelsandig bis mittelsandig, schwach schluffig bis schwach schluffig - Grundmoräne, Geschiebesand - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU (Sand, schluffig)-SU* (Sand, stark schluffig)	grau kalkfrei	schwach feucht bis feucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 7.3 1,30 - 1,70	

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 		Seite: 2 von 2 Aufschluss: BS 7 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25	
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
3,00	Feinsand, mittelsandig bis mittelsandig, schwach schluffig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU (Sand, schluffig)-SU (Sand, schluffig)	grau kalkfrei	schwach feucht bis feucht	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 7.4 1,70 - 3,00	

m u. GOK (45,49 m ü. NHN)

BS 7

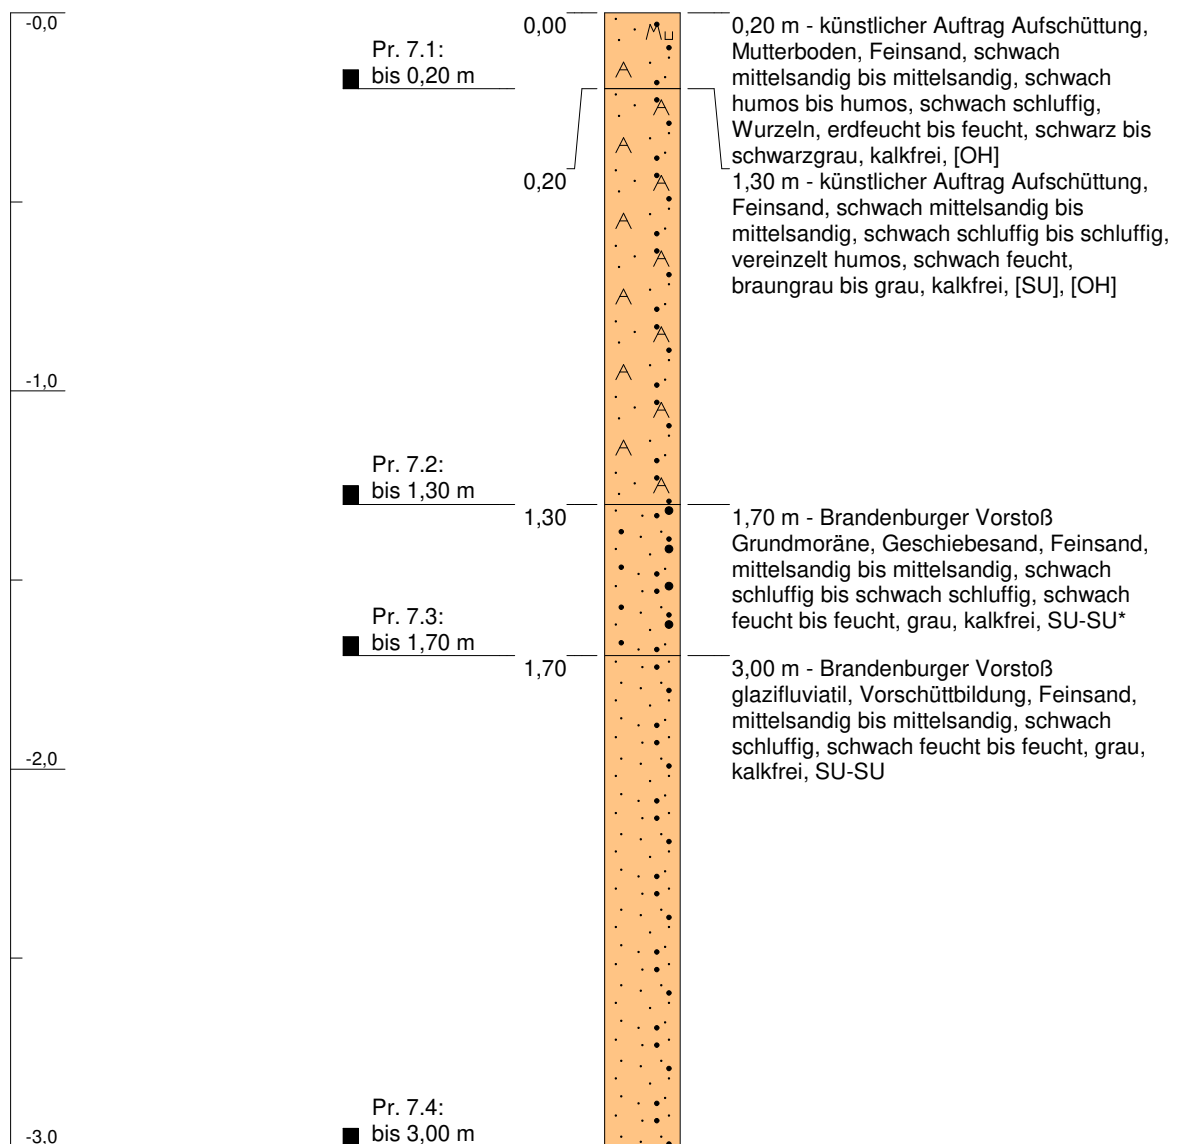

Höhenmaßstab: 1:20

Blatt 1 von 1

Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin					
Bohrung: BS 7					
Auftraggeber:		Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG	Ostwert:	379690 mE	
Bohrfirma:		AnalyTech GmbH Mittenwalde	Nordwert:	5786325 mN	
Bearbeiter:		Frau Giese	Ansatzhöhe:	45,49 m ü. NHN	
Datum:		24.03.2026	Anlage 2	Endtiefe:	3,0 m u. Ansatz




AnalyTech
BERLIN-BRANDENBURG

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 1 von 1 Aufschluss: BS 8 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,90	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach humos bis humos, schwach grobsandig, schwach schluffig vereinzelt Wurzeln - Aufschüttung, Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarz bis schwarzgrau kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	leicht zu bohren bis 'mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 8.1 0,00 - 0,90	
1,90	Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig, schwach humos - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)-SU (Sand, schluffig)	grau bis dunkelgrau kalkfrei	schwach feucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 8.2 0,90 - 1,90	
3,00	Feinsand, mittelsandig bis mittelsandig, schwach schluffig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)-SU (Sand, schluffig)	grau kalkfrei	schwach feucht bis feucht	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 8.3 1,90 - 3,00	

m u. GOK (46,22 m ü. NHN)

BS 8

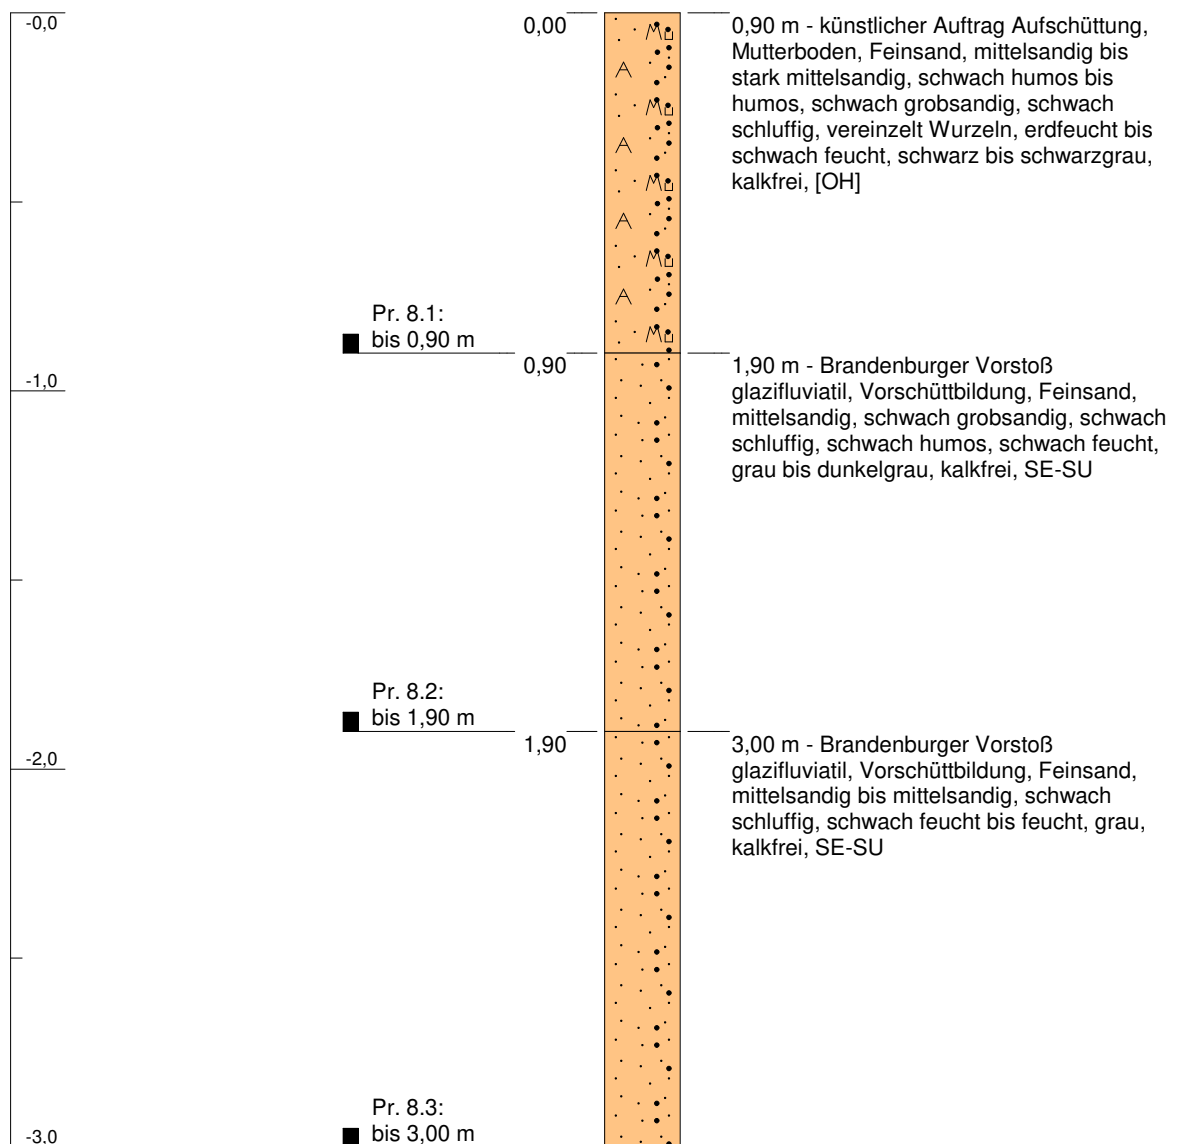

Höhenmaßstab: 1:20

Blatt 1 von 1


Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin			
Bohrung: BS 8			
Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG		Ostwert:	379697 mE
Bohrfirma: AnalyTech GmbH Mittenwalde		Nordwert:	5786333 mN
Bearbeiter: Frau Giese		Ansatzhöhe:	46,22 m ü. NHN
Datum: 24.03.2026	Anlage 2	Endtiefe:	3,0 m u. Ansatz

**AnalyTech**
BERLIN-BRANDENBURG

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1  AnalyTech BERLIN-BRANDENBURG			Seite: 1 von 1 Aufschluss: BS 10 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,80	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach humos bis humos, schwach grobsandig, schwach schluffig vereinzelt Wurzeln, Pflanzenreste, Kiesel - Aufschüttung, Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	dunkelbraun bis schwarzbraun kalkfrei	erdfeucht	sehr leicht zu bohren bis 'leicht zu bohren	bgp Pr. 10.1 0,00 - 0,80	
3,00	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach grobsandig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	hellbraun bis beige kalkfrei	schwach feucht bis feucht	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 10.2 0,80 - 2,00 bgp Pr. 10.3 2,00 - 3,00	

m u. GOK (40,72 m ü. NHN)

BS 10

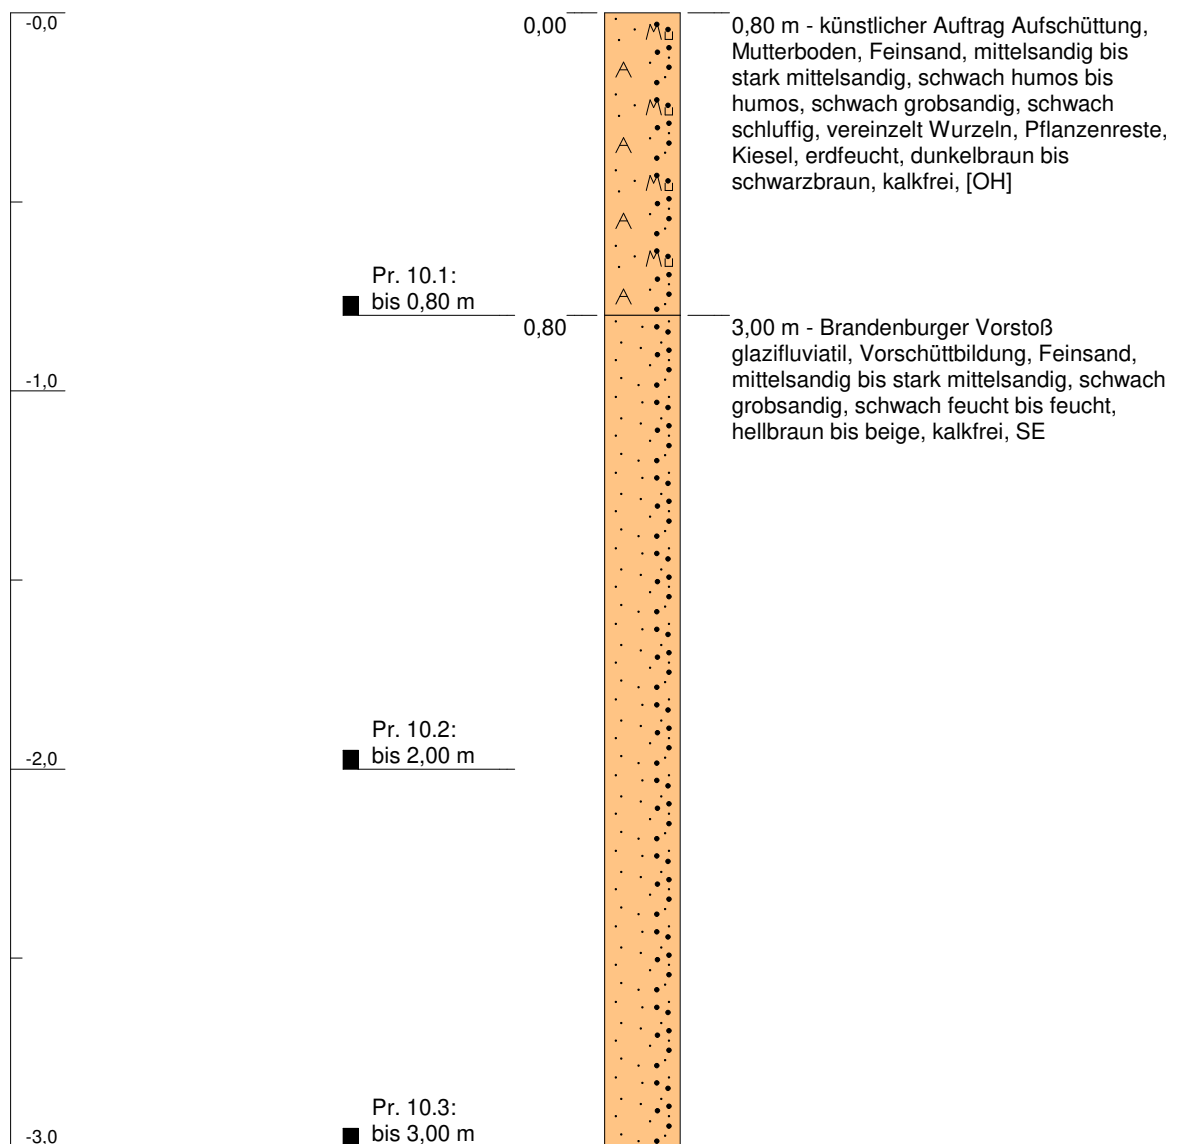

Höhenmaßstab: 1:20

Blatt 1 von 1


Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin			
Bohrung: BS 10			
Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG		Ostwert: 379499 mE	
Bohrfirma: AnalyTech GmbH Mittenwalde		Nordwert: 5786187 mN	
Bearbeiter: Frau Giese		Ansatzhöhe: 40,72 m ü. NHN	
Datum: 24.03.2026	Anlage 2	Endtiefe: 3,0 m u. Ansatz	



AnalyTech
BERLIN-BRANDENBURG

m u. GOK (40,62 m ü. NHN)

BS 11

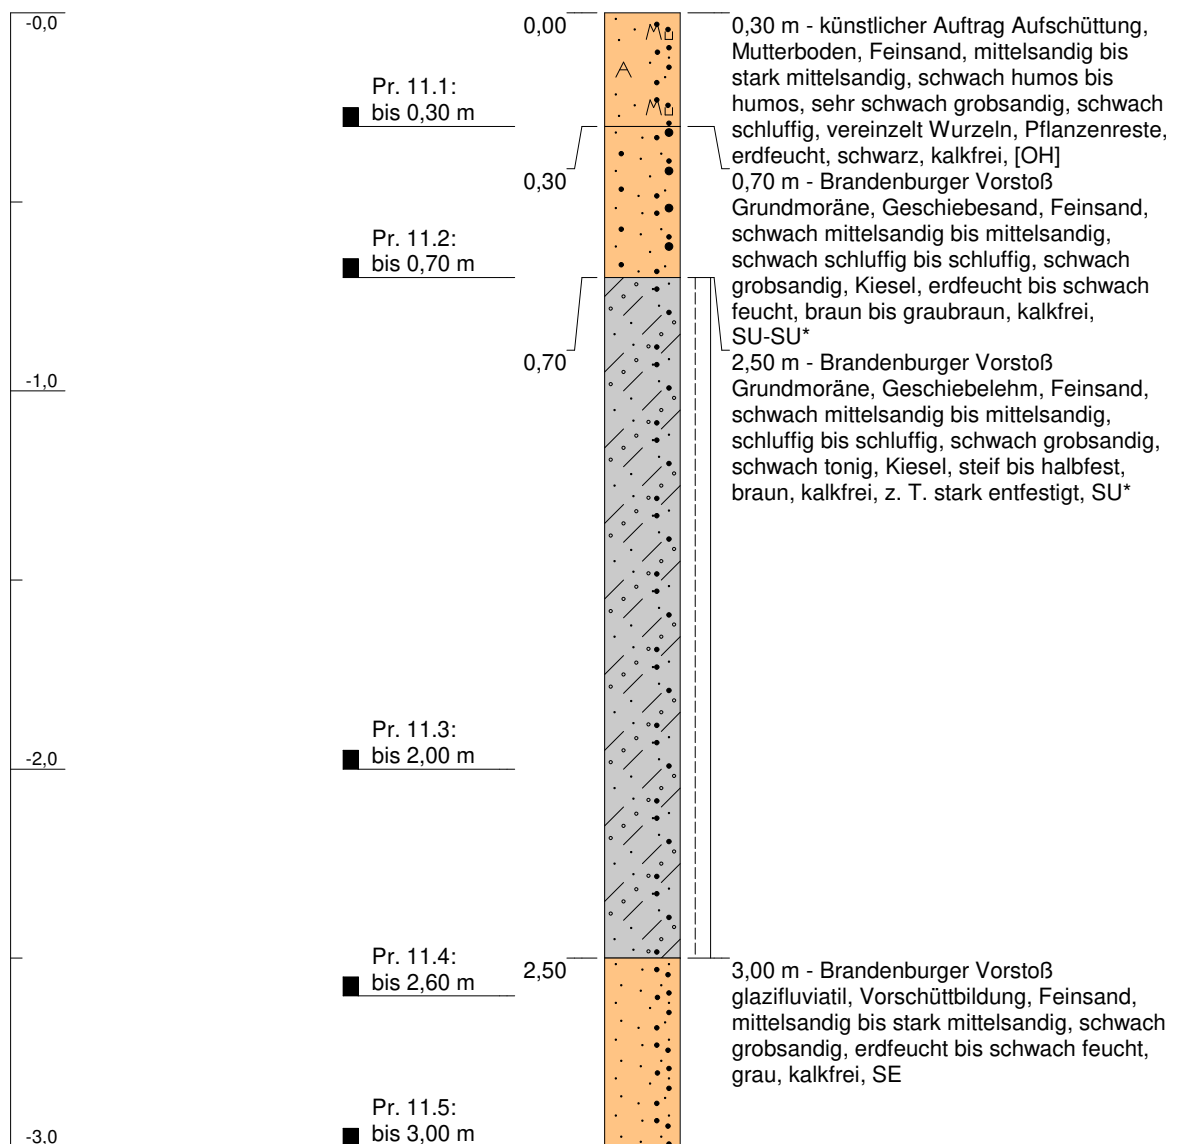

Höhenmaßstab: 1:20

Blatt 1 von 1

Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin
Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin

Bohrung: BS 11

Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Ostwert: 379536 mE

Bohrfirma: AnalyTech GmbH Mittenwalde Nordwert: 5786202 mN

Bearbeiter: Frau Giese Ansatzhöhe: 40,62 m ü. NHN

Datum: 24.03.2026 Anlage 2 Endtiefe: 3,0 m u. Ansatz



Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 1 von 2 Aufschluss: BS 11 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,30	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach humos bis humos, sehr schwach grobsandig, schwach schluffig vereinzelt Wurzeln, Pflanzenreste - Aufschüttung, Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarz kalkfrei	erdfeucht	sehr leicht zu bohren bis 'leicht zu bohren	bgp Pr. 11.1 0,00 - 0,30	
0,70	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig, schwach grobsandig Kiesel - Grundmoräne, Geschiebesand - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU (Sand, schluffig)-SU* (Sand, stark schluffig)	braun bis graubraun kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 11.2 0,30 - 0,70	
2,50	Geschiebelehm, Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schluffig bis schluffig, schwach grobsandig, schwach tonig Kiesel - Grundmoräne - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU* (Sand, stark schluffig)	braun kalkfrei	steif bis halbfest	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 11.3 0,70 - 2,00	z. T. stark entfestigt


Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 		Seite: 2 von 2 Aufschluss: BS 11 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25	
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
3,00	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach grobsandig - glazifluvial, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	grau kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 11.4 2,00 - 2,60 bgp Pr. 11.5 2,60 - 3,00	

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 1 von 2 Aufschluss: BS 12 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,05	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach humos bis humos, sehr schwach grobsandig, schwach schluffig vereinzelt Wurzeln, Pflanzenreste - Aufschüttung, Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarzgrau bis schwarz kalkfrei	erdfeucht	sehr leicht zu bohren	bgp Pr. 12.1 0,00 - 0,05	Grasnarbe
0,70	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig, schwach grobsandig Kiesel - Grundmoräne, Geschiebesand - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU (Sand, schluffig)-SU* (Sand, stark schluffig)	braun bis hellbraun kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 12.2 0,05 - 0,70	
2,20	Geschiebelehm, Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schluffig bis schluffig, schwach grobsandig, schwach tonig Kiesel - Grundmoräne - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU* (Sand, stark schluffig)	braun kalkfrei	steif bis halbfest	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 12.3 0,70 - 2,20	z. T. stark entfestigt

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 		Seite: 2 von 2 Aufschluss: BS 12 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25	
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
3,00	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach grobsandig - glazifluvial, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	grau kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 12.4 2,20 - 3,00	

m u. GOK (40,36 m ü. NHN)

BS 12

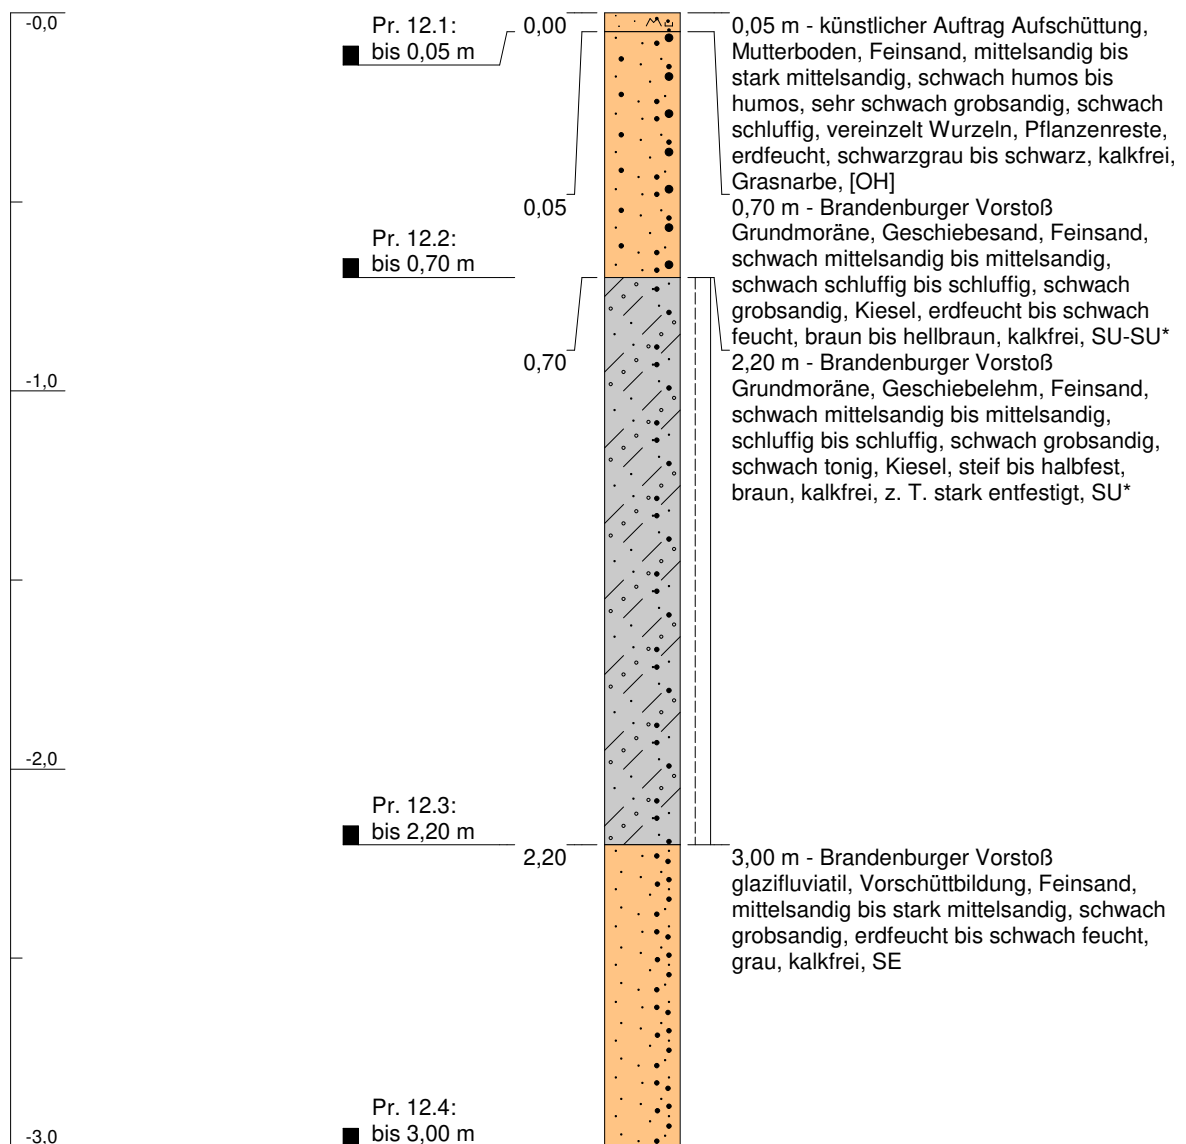

Höhenmaßstab: 1:20

Blatt 1 von 1

Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin			
Bohrung: BS 12			
Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG		Ostwert: 379552 mE	
Bohrfirma: AnalyTech GmbH Mittenwalde		Nordwert: 5786223 mN	
Bearbeiter: Frau Giese		Ansatzhöhe: 40,36 m ü. NHN	
Datum: 24.03.2026	Anlage 2	Endtiefe: 3.0 m u. Ansatz	




AnalyTech
BERLIN-BRANDENBURG

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 1 von 2 Aufschluss: BS 13 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,10	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach humos bis humos, sehr schwach grobsandig, schwach schluffig vereinzelt Wurzeln, Pflanzenreste - Aufschüttung, Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarzgrau bis schwarz kalkfrei	erdfeucht	sehr leicht zu bohren	bgp Pr. 13.1 0,00 - 0,10	Grasnarbe / Krautschicht
0,80	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig, schwach grobsandig Kiesel - Grundmoräne, Geschiebesand - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU (Sand, schluffig)-SU* (Sand, stark schluffig)	braun bis hellbraun kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 13.2 0,10 - 0,80	Schichtenwasser bei 0,8 m u. GOK
1,90	Geschiebelehm, Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schluffig bis schluffig, schwach grobsandig, schwach tonig Kiesel - Grundmoräne - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU* (Sand, stark schluffig)	braun kalkfrei	steif	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 13.3 0,80 - 1,90	

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 		Seite: 2 von 2 Aufschluss: BS 13 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25	
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
3,00	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach grobsandig - glazifluvial, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	grau kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 13.4 1,90 - 3,00	

m u. GOK (39,72 m ü. NHN)

BS 13

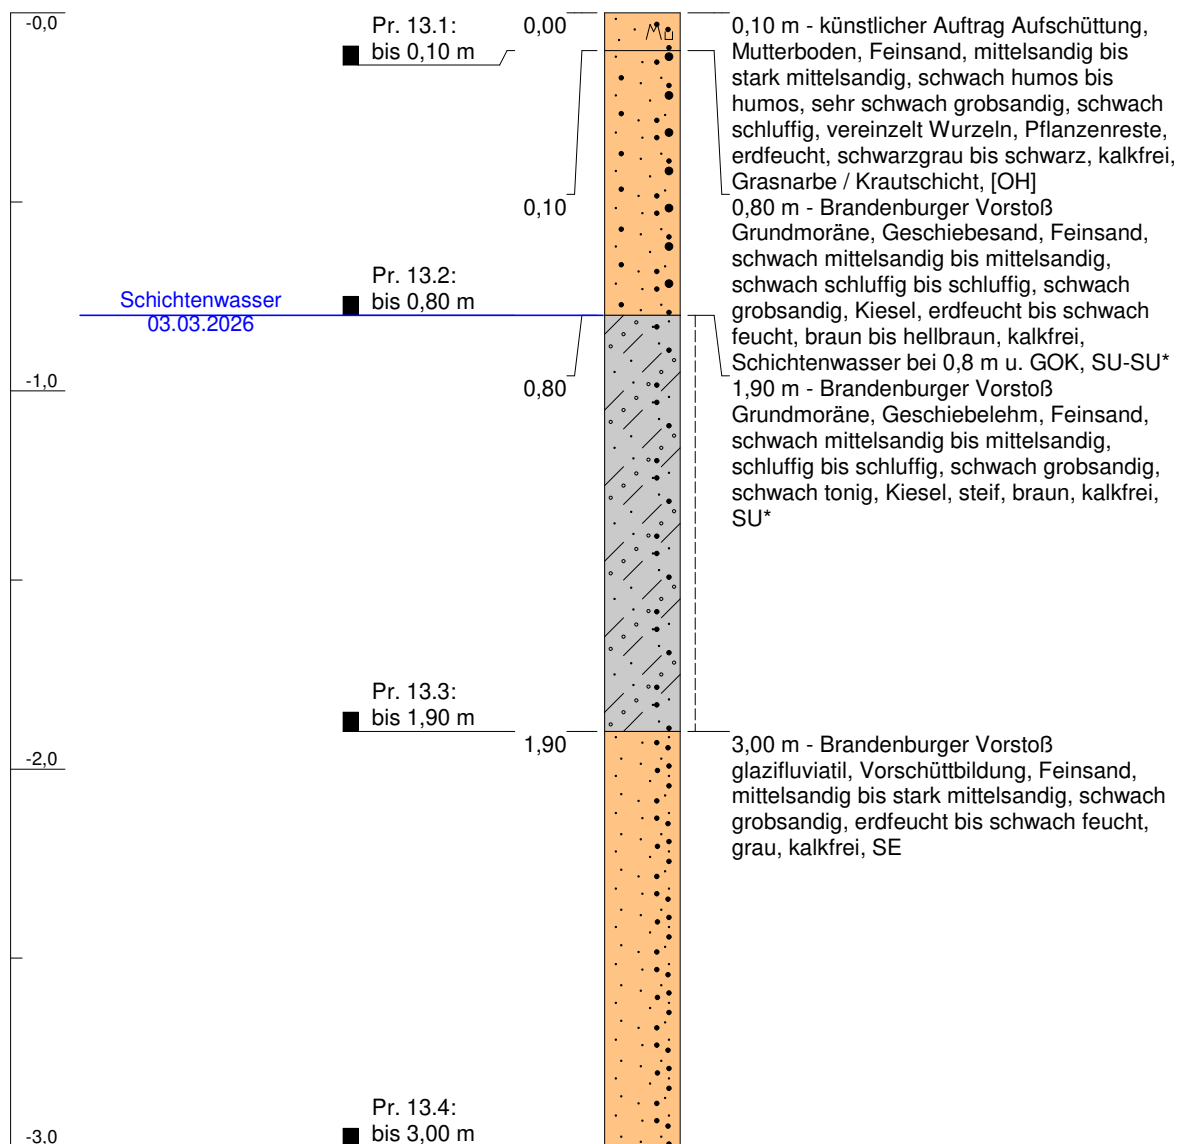

Höhenmaßstab: 1:20

Blatt 1 von 1

Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin			
Bohrung: BS 13			
Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG		Ostwert: 379526 mE	
Bohrfirma: AnalyTech GmbH Mittenwalde		Nordwert: 5786226 mN	
Bearbeiter: Frau Giese		Ansatzhöhe: 39,72 m ü. NHN	
Datum: 24.03.2026	Anlage 2	Endtiefe: 3,0 m u. Ansatz	




AnalyTech
BERLIN-BRANDENBURG

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 1 von 2 Aufschluss: BS 14 / DPH 2 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,10	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach humos bis humos, sehr schwach grobsandig, schwach schluffig vereinzelt Wurzeln, Pflanzenreste - Aufschüttung, Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarzgrau bis schwarz kalkfrei	erdfeucht	sehr leicht zu bohren	bgp Pr. 14.1 0,00 - 0,10	Grasnarbe / Krautschicht
1,20	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig, vereinzelt tonig Kiesel - Grundmoräne, Geschiebesand - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU (Sand, schluffig)-SU* (Sand, stark schluffig)	braun bis hellbraun kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht, locker gelagert bis mitteldicht gelagert	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 14.2 0,10 - 1,20	
2,70	Geschiebelehm, Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schluffig bis schluffig, schwach grobsandig, schwach tonig Kiesel - Grundmoräne - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU* (Sand, stark schluffig)	braun kalkfrei	steif	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 14.3 1,20 - 2,00 bgp Pr. 14.4 2,00 - 2,70	

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 2 von 2 Aufschluss: BS 14 / DPH 2 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
4,70	Grobsand, feinkiesig, stark mittelsandig, schwach feinsandig Kiesel - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SI (Sand, intermittierend)	braun kalkfrei	schwach feucht bis feucht, mitteldicht gelagert	leicht zu bohren bis 'mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 14.5 2,70 - 4,00 bgp Pr. 14.6 4,00 - 4,70	Grundwasserspiegel (4,70)
6,70	Grobsand, feinkiesig, stark mittelsandig, schwach feinsandig Kiesel - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SI (Sand, intermittierend)	braun kalkfrei	nass, mitteldicht gelagert	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 14.7 4,70 - 6,00 bgp Pr. 14.8 6,00 - 6,70	
8,00	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach grobsandig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	grau kalkfrei	nass, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 14.9 6,70 - 8,00	

BS 14 / DPH 2

m u. GOK (40,58 m ü. NHN)

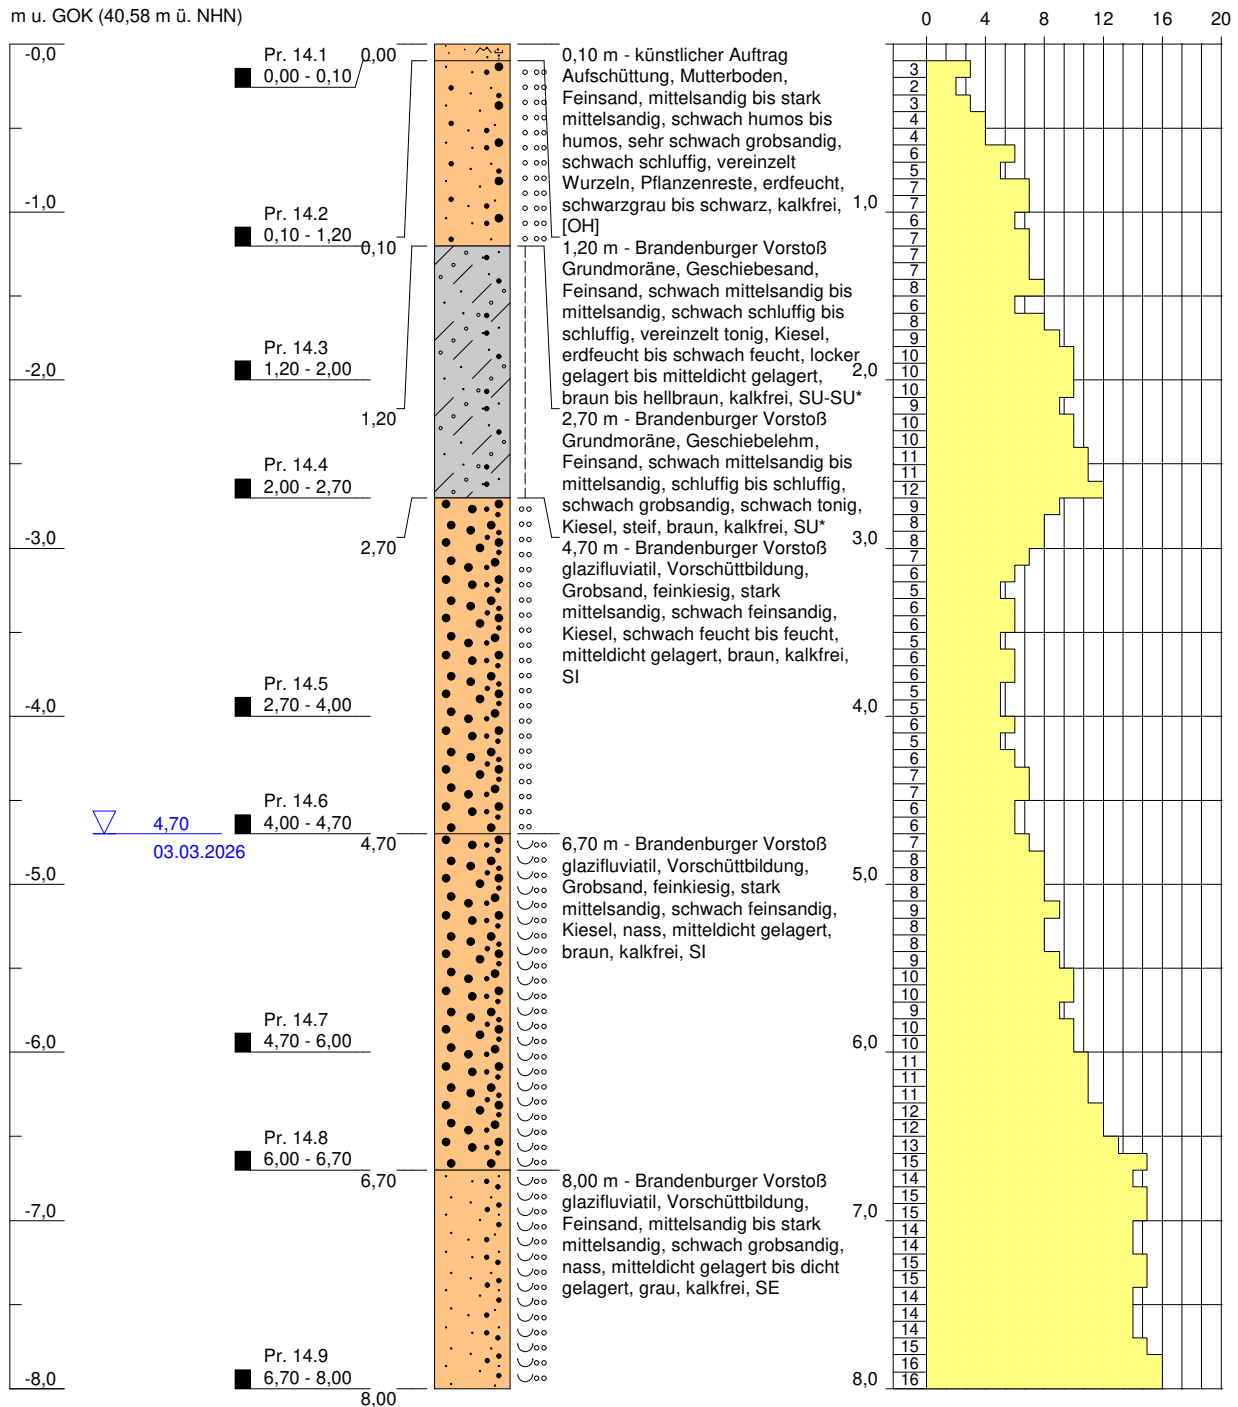

N10 Anzahl der Schläge
pro 10 cm Eindringtiefe

Höhenmaßstab: 1:45

Blatt 1 von 1

Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin
Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin

Bohrung: BS 14 / DPH 2

Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Ostwert: 379570,19 mE

Bohrfirma: AnalyTech GmbH Mittenwalde Nordwert: 5786250,27 mN

Bearbeiter: Frau Giese Ansatzhöhe: 40,58 m ü. NHN

Datum: 24.03.2026 Endtiefe: 8,0 m u. Ansatz




Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 1 von 2 Aufschluss: BS 15 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,05	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach humos bis humos, sehr schwach grobsandig, schwach schluffig vereinzelt Wurzeln, Pflanzenreste - Aufschüttung, Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarzgrau bis schwarz kalkfrei	erdfeucht	sehr leicht zu bohren		Grasnarbe / Krautschicht
0,90	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig Kiesel - Grundmoräne, Geschiebesand - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU (Sand, schluffig)-SU* (Sand, stark schluffig)	graubraun bis braungrau kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 15.1 0,00 - 0,10 bgp Pr. 15.2 0,10 - 0,90	
1,60	Geschiebelehm, Feinsand, schluffig bis stark schluffig, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach grobsandig, schwach tonig Kiesel - Grundmoräne - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU* (Sand, stark schluffig)	braun kalkfrei	steif	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 15.3 0,90 - 1,60	

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 2 von 2 Aufschluss: BS 15 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
2,70	Geschiebemergel, Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schluffig bis schluffig, schwach grobsandig, schwach tonig Kiesel - Grundmoräne - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU* (Sand, stark schluffig)	graubraun bis grau kalkfrei	steif bis halbfest	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 15.4 1,60 - 2,70	
3,00	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach grobsandig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	grau kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 15.5 2,70 - 3,00	

m u. GOK (40,03 m ü. NHN)

BS 15

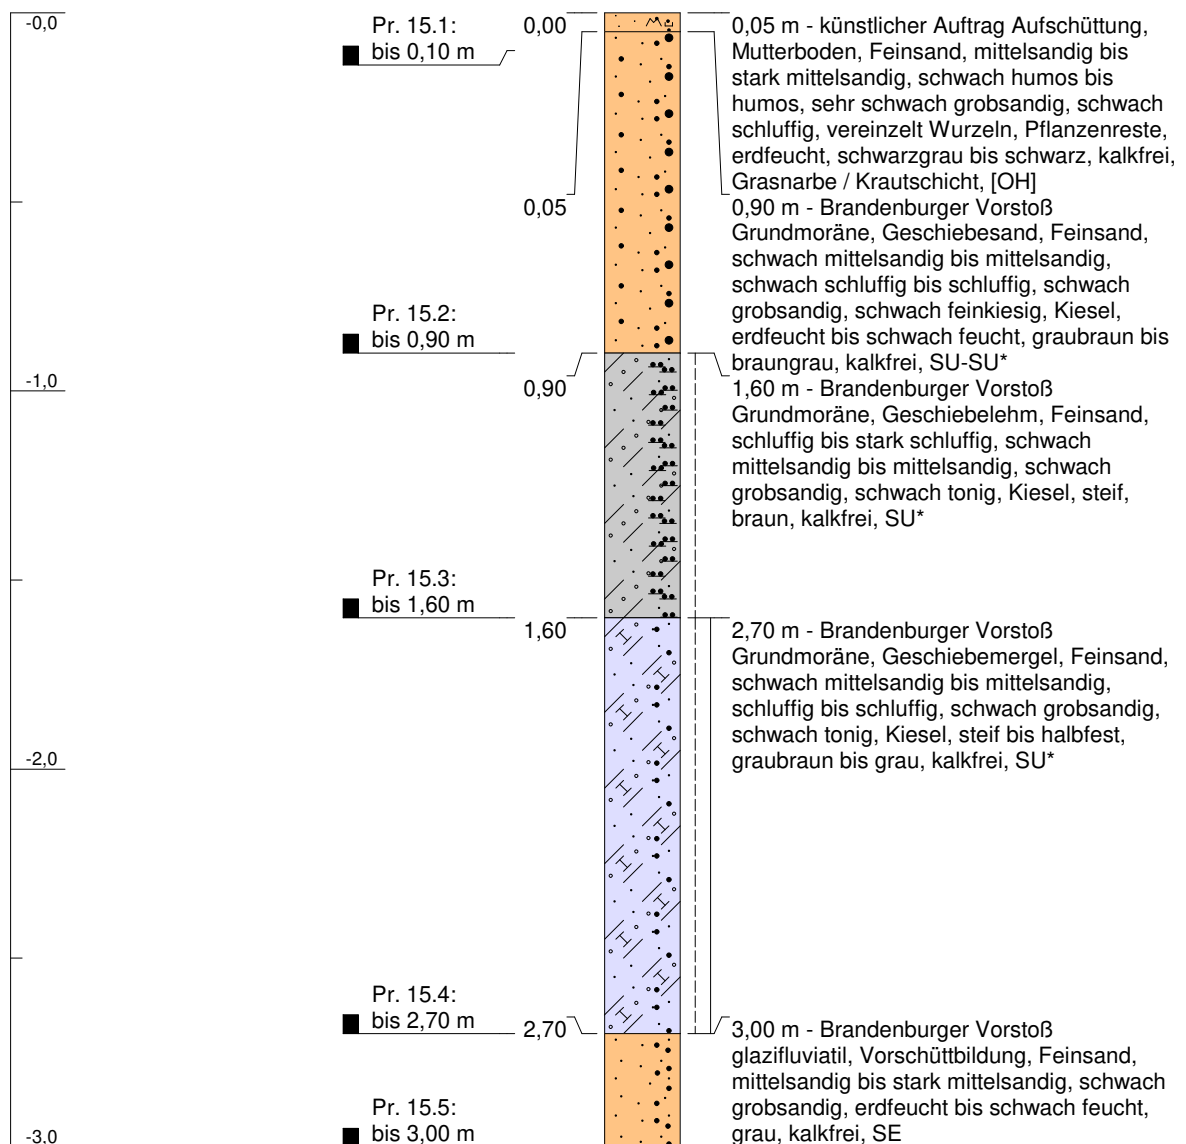

Höhenmaßstab: 1:20

Blatt 1 von 1

Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin			
Bohrung: BS 15			
Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG		Ostwert: 379550 mE	
Bohrfirma: AnalyTech GmbH Mittenwalde		Nordwert: 5786249 mN	
Bearbeiter: Frau Giese		Ansatzhöhe: 40,03 m ü. NHN	
Datum: 24.03.2026	Anlage 2	Endtiefe: 3,0 m u. Ansatz	




AnalyTech
BERLIN-BRANDENBURG

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 		Seite: 1 von 1 Aufschluss: BS 16 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25	
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,90	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach humos bis humos, schwach schluffig vereinzelt Wurzeln, Pflanzenreste, Kiesel - Aufschüttung, Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	dunkelbraun bis braunschwarz kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	sehr leicht zu bohren bis 'leicht zu bohren	bgp Pr. 16.1 0,00 - 0,90	
3,00	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach grobsandig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	hellbraun bis braun kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 16.2 0,90 - 2,00 bgp Pr. 16.3 2,00 - 3,00	

m u. GOK (40,55 m ü. NHN)

BS 16

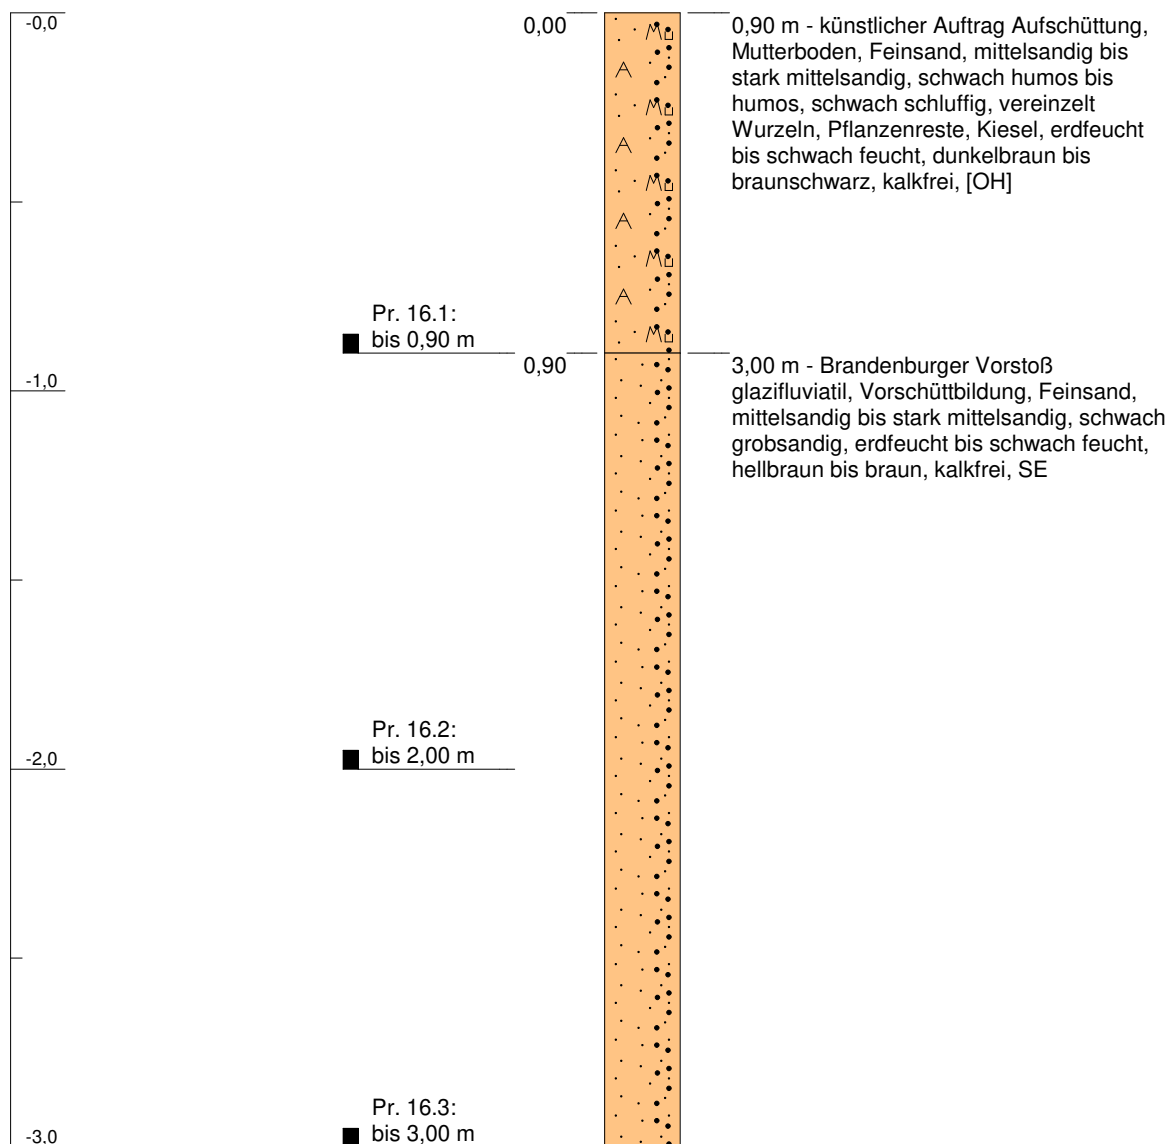

Höhenmaßstab: 1:20

Blatt 1 von 1


Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin			
Bohrung: BS 16			
Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG		Ostwert:	379478 mE
Bohrfirma: AnalyTech GmbH Mittenwalde		Nordwert:	5786149 mN
Bearbeiter: Frau Giese		Ansatzhöhe:	40,55 m ü. NHN
Datum: 24.03.2026	Anlage 2	Endtiefe:	3,0 m u. Ansatz

**AnalyTech**
BERLIN-BRANDENBURG

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 		Seite: 1 von 1 Aufschluss: BS 17 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25	
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,90	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach humos bis humos, schwach schluffig vereinzelt Wurzeln, Pflanzenreste, Kiesel - Aufschüttung, Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarzbraun bis dunkelbraun kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	sehr leicht zu bohren	bgp Pr. 17.1 0,00 - 0,90	
3,00	Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach grobsandig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	hellbraun bis braun kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 17.2 0,90 - 2,00 bgp Pr. 17.3 2,00 - 3,00	

m u. GOK (40,11 m ü. NHN)

BS 17

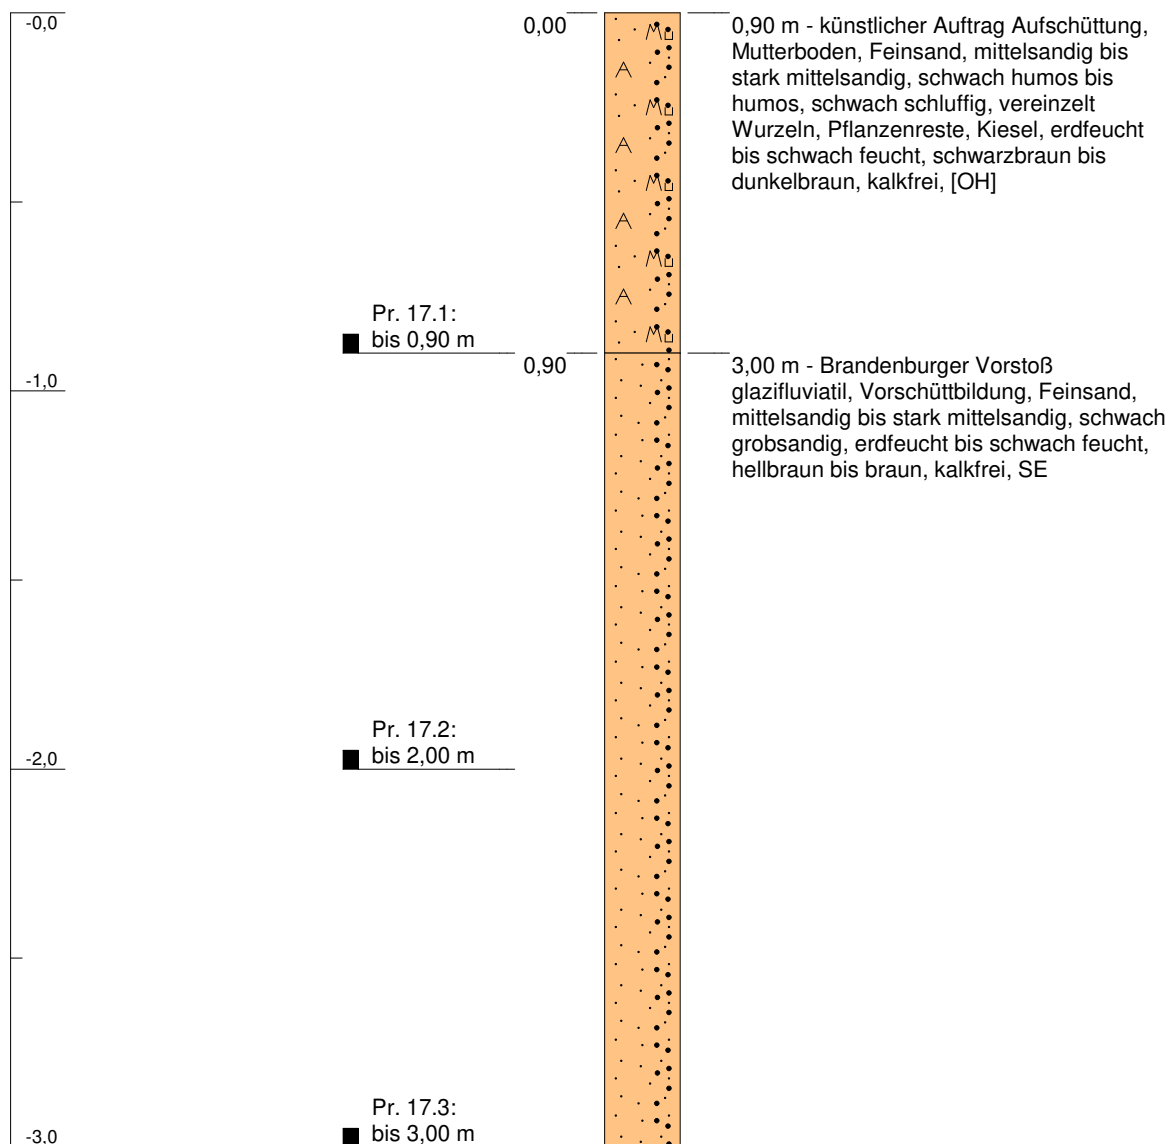

Höhenmaßstab: 1:20

Blatt 1 von 1

Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin			
Bohrung: BS 17			
Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG		Ostwert:	379488 mE
Bohrfirma: AnalyTech GmbH Mittenwalde		Nordwert:	5786230 mN
Bearbeiter: Frau Giese		Ansatzhöhe:	40,11 m ü. NHN
Datum: 24.03.2026	Anlage 2	Endtiefe:	3,0 m u. Ansatz



AnalyTech
BERLIN-BRANDENBURG


Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 1 von 3 Aufschluss: BS 18 / DPH 3 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,20	Beton - Beton Bodengruppe:					
0,80	Feinsand, mittelsandig, humos, schwach grobsandig, schwach humos bis humos Kohlegrus - Aufschüttung, Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarz bis schwarzgrau kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht, locker gelagert	leicht zu bohren bis 'mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 18.1 0,20 - 0,80	Fremdbestandanteil FM < 10 %
3,40	Feinsand, schwach mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	braun bis hellbraun, beige kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht, locker gelagert bis mitteldicht gelagert	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 18.2 0,80 - 2,00 bgp Pr. 18.3 2,00 - 3,40	

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 2 von 3 Aufschluss: BS 18 / DPH 3 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
3,80	Grobsand, schwach feinsandig, schwach mittelsandig, schwach feinsandig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)-SI (Sand, intermittierend)	graubraun kalkfrei	feucht, mitteldicht gelagert	leicht zu bohren bis 'mäßig schwer zu bohren		Grundwasserspiegel (3,80)
4,80	Grobsand, schwach feinsandig, schwach mittelsandig, schwach feinsandig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)-SI (Sand, intermittierend)	graubraun kalkfrei	feucht, mitteldicht gelagert	leicht zu bohren bis 'mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 18.4 3,40 - 4,00 bgp Pr. 18.5 4,00 - 4,80	
8,00	Feinsand, schwach mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	braun bis hellbraun, beige kalkfrei	nass, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 18.6 4,80 - 6,00	

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1  AnalyTech BERLIN-BRANDENBURG		Seite: 3 von 3 Aufschluss: BS 18 / DPH 3 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25	
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
					bgp Pr. 18.7 6,00 - 7,00 bgp Pr. 18.8 7,00 - 8,00	

BS 18 / DPH 3

m u. GOK (39,55 m ü. NHN)

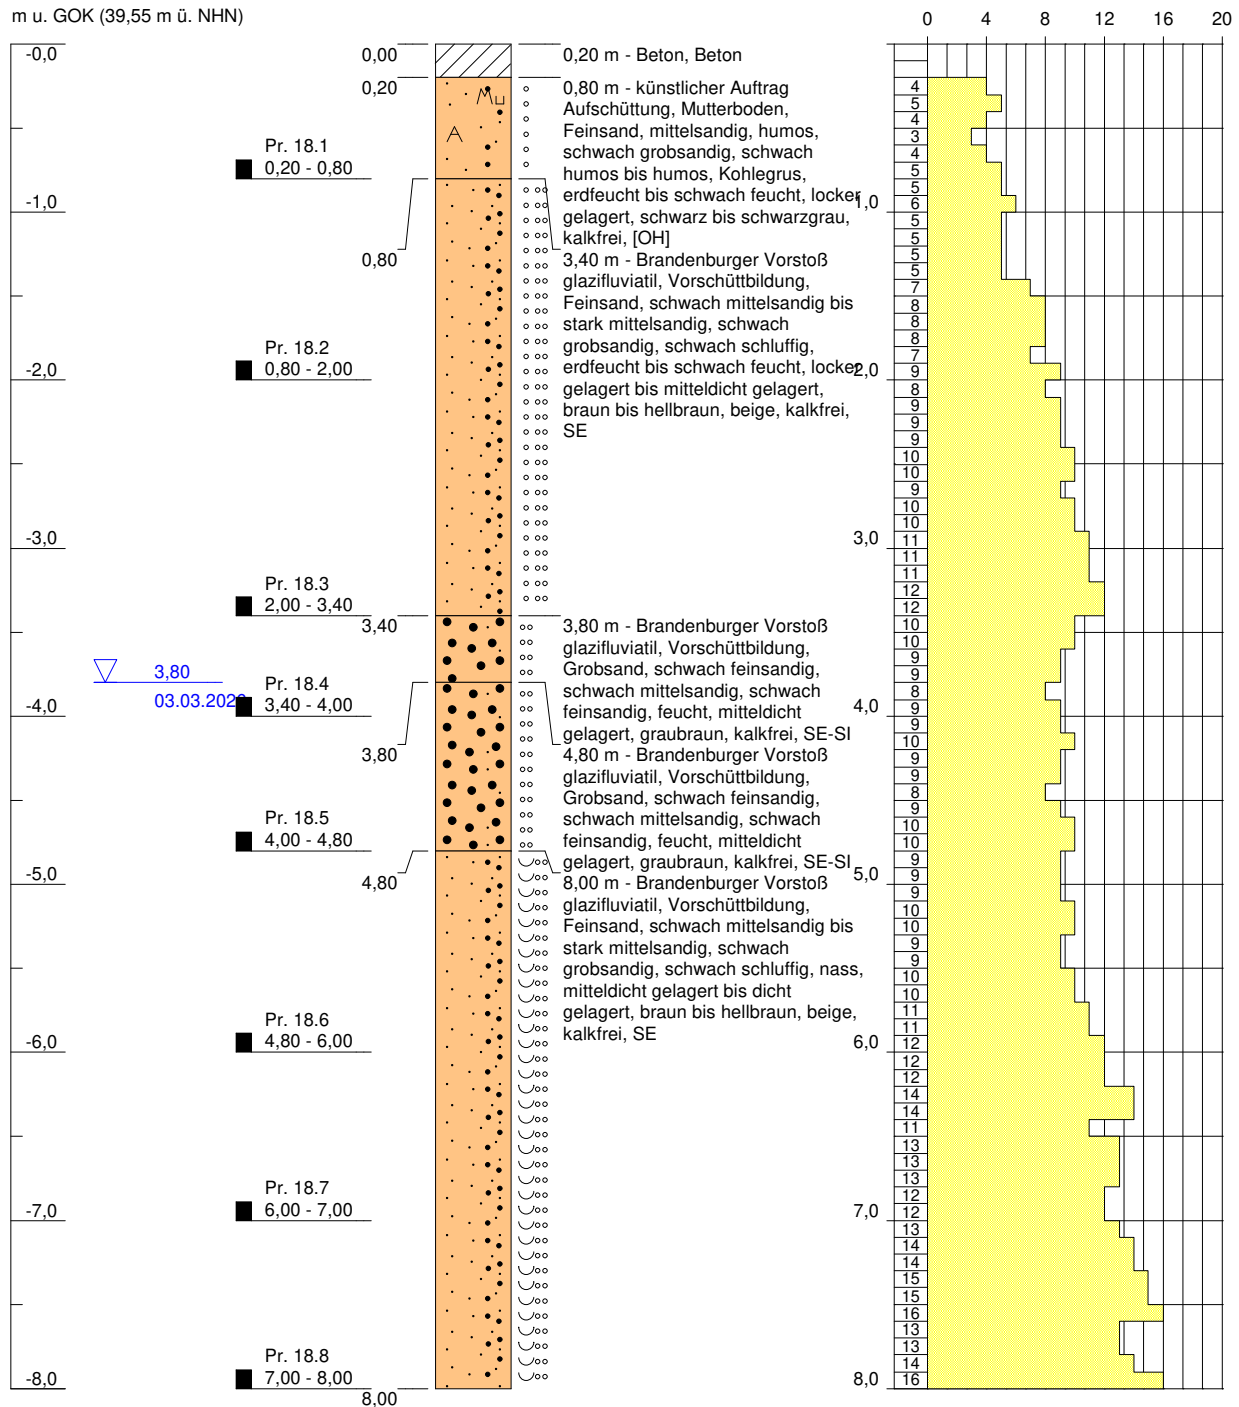

N10 Anzahl der Schläge
pro 10 cm Eindringtiefe

Höhenmaßstab: 1:45


Blatt 1 von 1

Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin				
Bohrung: BS 18 / DPH 3				
Auftraggeber:	Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG		Ostwert:	379476,44 mE
Bohrfirma:	AnalyTech GmbH Mittenwalde		Nordwert:	5786248,26 mN
Bearbeiter:	Frau Giese		Ansatzhöhe:	39,55 m ü. NHN
Datum:	24.03.2026		Endtiefe:	8,0 m u. Ansatz

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 1 von 1 Aufschluss: BS 19 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,90	Feinsand, mittelsandig, schwach humos bis humos, schwach grobsandig, schwach schluffig Ziegelbruchstücke, Betonbruchstücke - Aufschüttung, Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarzbraun bis schwarz kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	leicht zu bohren bis 'mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 19.1 0,00 - 0,90	Fremdbestandanteil FB < 10 %
1,50	Feinsand, mittelsandig, schwach humos bis humos, schwach schluffig bis schluffig - Aufschüttung - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [SU], [OH]	grau kalkfrei	schwach feucht	leicht zu bohren bis 'mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 19.2 0,90 - 1,50	
1,90	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig, schwach tonig Kiesel - Grundmoräne, Geschiebesand - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU (Sand, schluffig)-SU* (Sand, stark schluffig)	hellbraun bis braun kalkfrei	schwach feucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 19.3 1,50 - 1,90	
3,00	Feinsand, schwach mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach schluffig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	hellbraun bis beige kalkfrei	schwach feucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 19.4 1,90 - 3,00	

m u. GOK (39,83 m ü. NHN)

BS 19

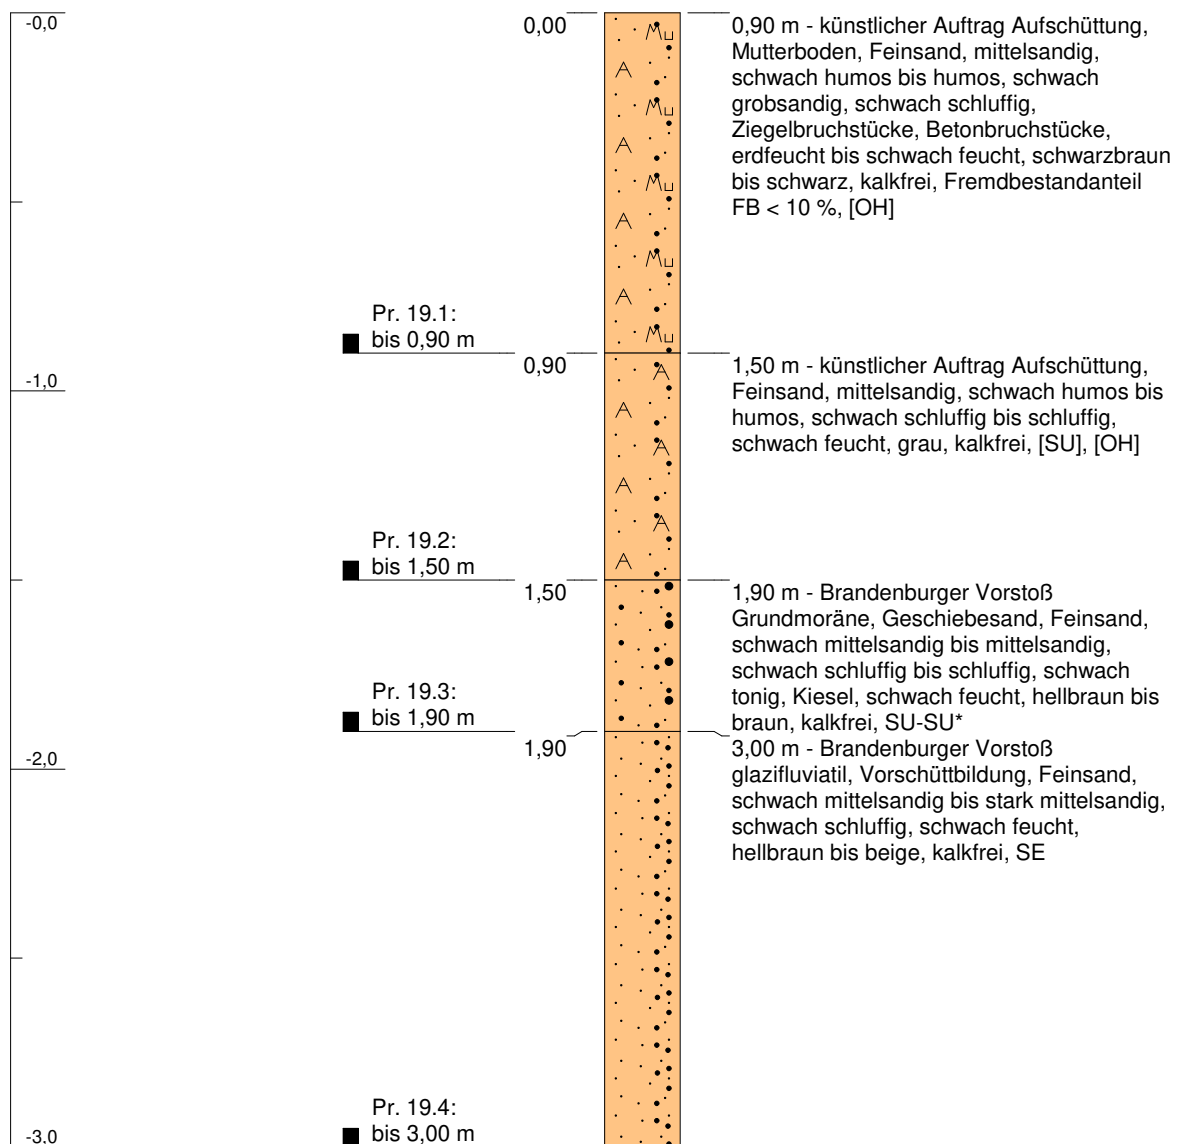

Höhenmaßstab: 1:20

Blatt 1 von 1

Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin			
Bohrung: BS 19			
Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG		Ostwert: 379529 mE	
Bohrfirma: AnalyTech GmbH Mittenwalde		Nordwert: 5786299 mN	
Bearbeiter: Frau Giese		Ansatzhöhe: 39,83 m ü. NHN	
Datum: 24.03.2026	Anlage 2	Endtiefe: 3,0 m u. Ansatz	




AnalyTech
BERLIN-BRANDENBURG

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 1 von 1 Aufschluss: BS 20 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,90	Feinsand, mittelsandig, schwach humos bis humos, schwach grobsandig, schwach schluffig, schwach feinkiesig vereinzelt Wurzeln - Aufschüttung, Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [SU], [OH]	schwarz bis braunschwarz kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	sehr leicht zu bohren bis 'leicht zu bohren	bgp Pr. 20.1 0,00 - 0,90	
1,80	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig, vereinzelt schwach tonig Kiesel - Grundmoräne, Geschiebesand - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU (Sand, schluffig)-SU* (Sand, stark schluffig)	grau bis braungrau kalkfrei	schwach feucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 20.2 0,90 - 1,80	
3,00	Feinsand, schwach mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	hellbraun bis braun kalkfrei	schwach feucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 20.3 1,80 - 3,00	

m u. GOK (41,76 m ü. NHN)

BS 20

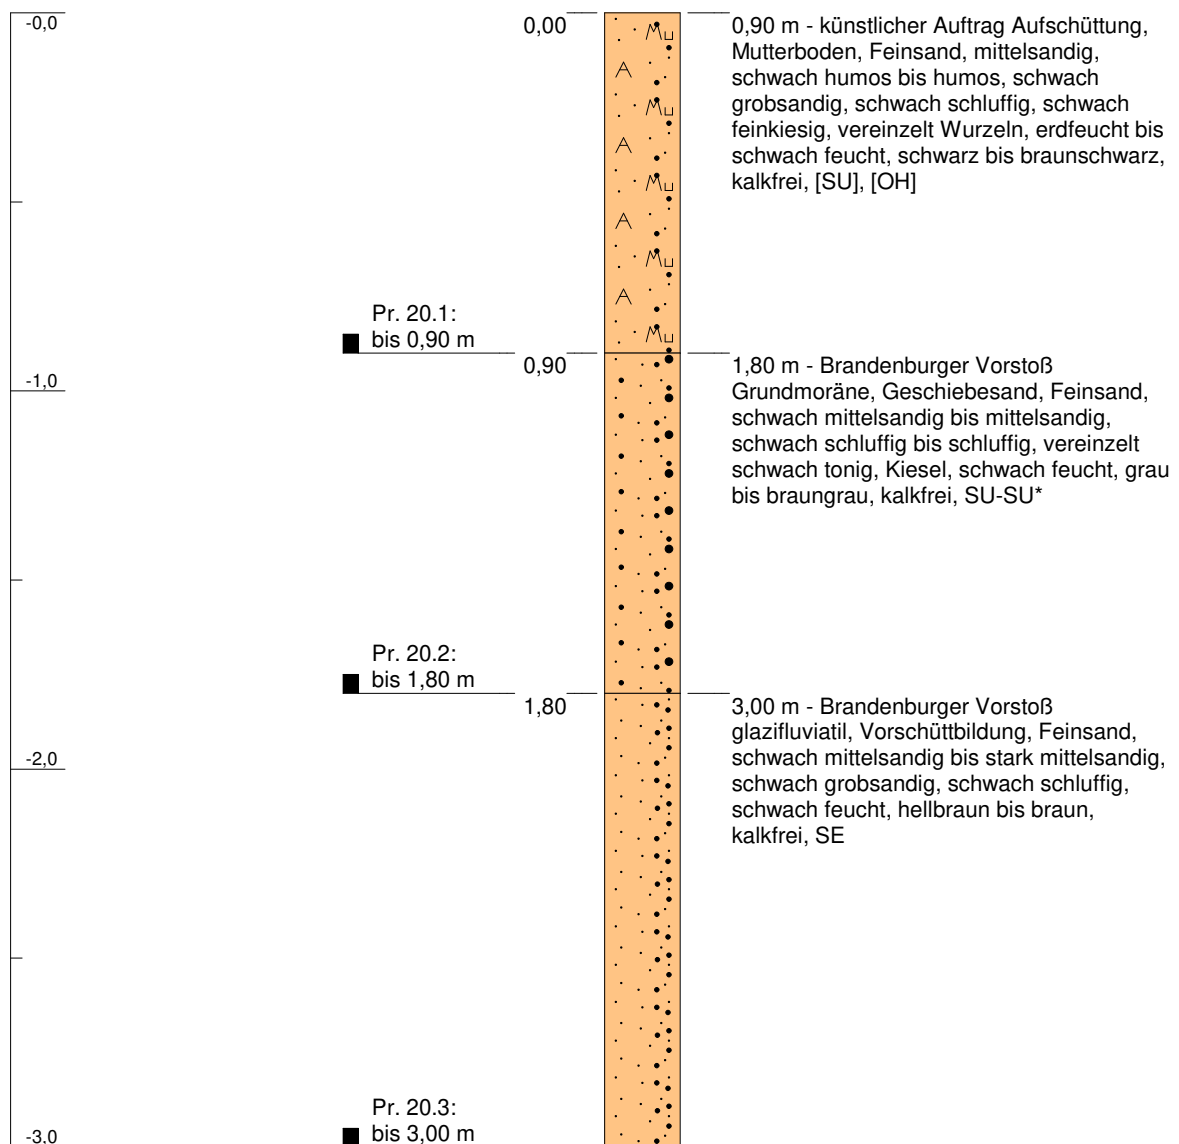

Höhenmaßstab: 1:20

Blatt 1 von 1

Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin			
Bohrung: BS 20			
Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG		Ostwert: 379613 mE	
Bohrfirma: AnalyTech GmbH Mittenwalde		Nordwert: 5786316 mN	
Bearbeiter: Frau Giese		Ansatzhöhe: 41,76 m ü. NHN	
Datum: 24.03.2026	Anlage 2	Endtiefe: 3,0 m u. Ansatz	



AnalyTech
BERLIN-BRANDENBURG


Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 1 von 3 Aufschluss: BS 21 / DPH 4 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
1,20	Feinsand, mittelsandig, schwach humos bis humos, schwach grobsandig, schwach schluffig vereinzelt Wurzeln - Aufschüttung, Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarz bis schwarzgrau kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht, locker gelagert	leicht zu bohren		
2,30	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig - Grundmoräne, Geschiebesand - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU (Sand, schluffig)-SU* (Sand, stark schluffig)	hellbraun bis braun kalkfrei	schwach feucht, mitteldicht gelagert	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 21.1 0,00 - 1,30 bgp Pr. 21.2 1,20 - 2,30	
4,00	Feinsand, schwach mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	hellbraun bis braun kalkfrei	schwach feucht bis feucht, mitteldicht gelagert	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 21.3 2,30 - 3,00 bgp Pr. 21.4 3,00 - 4,00	

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1  AnalyTech BERLIN-BRANDENBURG			Seite: 2 von 3 Aufschluss: BS 21 / DPH 4 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
4,30	Grobsand, schwach feinkiesig bis feinkiesig, mittelsandig, schwach feinsandig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)-SI (Sand, intermittierend)	grau kalkfrei	feucht, mitteldicht gelagert	mäßig schwer zu bohren		Grundwasserspiegel (4,30)
6,00	Grobsand, schwach feinkiesig bis feinkiesig, mittelsandig, schwach feinsandig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)-SI (Sand, intermittierend)	grau kalkfrei	nass, mitteldicht gelagert	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 21.5 4,00 - 5,00 bgp Pr. 21.6 5,00 - 6,00	
8,00	Feinsand, schwach mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig - glazifluviatil, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	hellbraun bis braun kalkfrei	schwach feucht bis feucht, mitteldicht gelagert	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 21.7 6,00 - 7,00	

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 		Seite: 3 von 3 Aufschluss: BS 21 / DPH 4 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25	
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
					bgp Pr. 21.8 7,00 - 8,00	

BS 21 / DPH 4

m u. GOK (40,12 m ü. NHN)

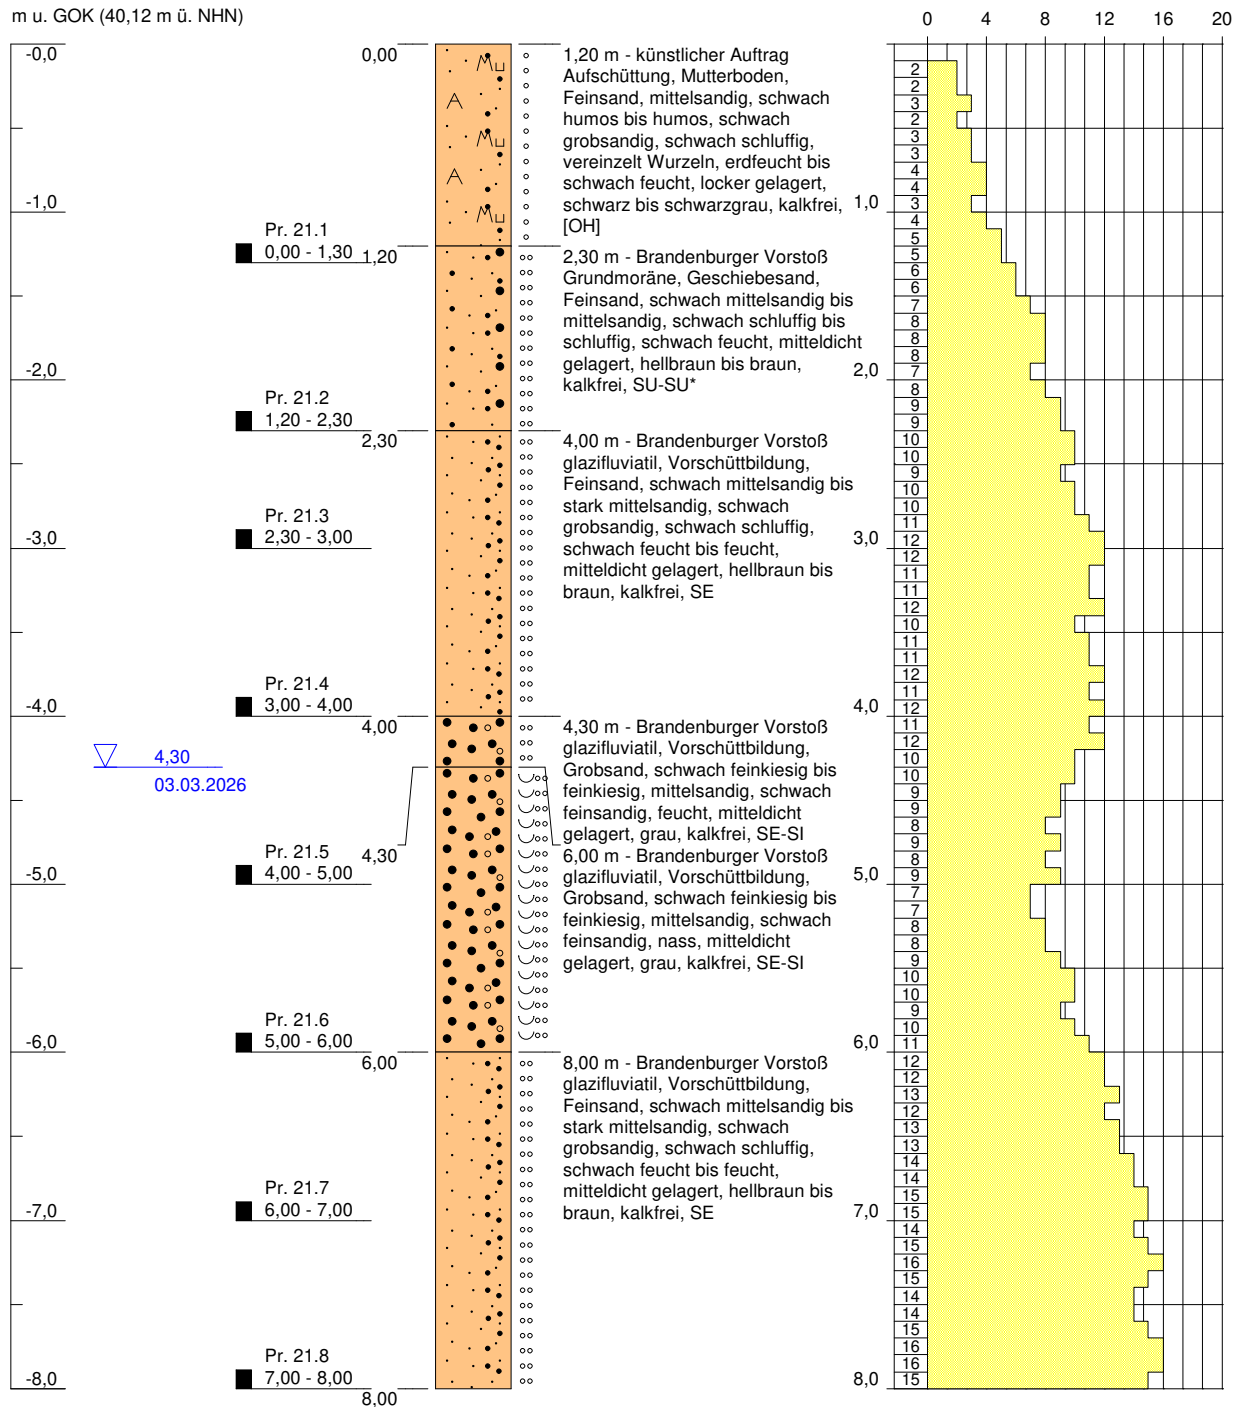

N10 Anzahl der Schläge
pro 10 cm Eindringtiefe

Höhenmaßstab: 1:45

Blatt 1 von 1

Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin	
Bohrung: BS 21 / DPH 4	
Auftraggeber:	Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG
Bohrfirma:	AnalyTech GmbH Mittenwalde
Bearbeiter:	Frau Giese
Datum:	24.03.2026

Ostwert:	379575,79 mE
Nordwert:	5786355,30 mN
Ansatzhöhe:	40,12 m ü. NHN
Endtiefe:	8,0 m u. Ansatz




AnalyTech
BERLIN-BRANDENBURG

Name des Unternehmens: AnalyTech Name des Auftraggebers: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG Projektbezeichnung: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Bohrverfahren: KRB Datum: 03.03.2026 Durchmesser: - Neigung: -			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1 			Seite: 1 von 1 Aufschluss: BS 22 Projekt-Nr.: 13688-D / 12 / 25
			Name / Unterschrift des Technikers: T. Biener, M. Fritzsche, U. Martin			
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis (m)	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,90	Feinsand, mittelsandig, schwach humos bis humos, schwach grobsandig, schwach schluffig vereinzelt Wurzeln - Aufschüttung, Mutterboden - künstlicher Auftrag Bodengruppe: [OH]	schwarz bis schwarzgrau kalkfrei	erdfeucht bis schwach feucht	leicht zu bohren	bgp Pr. 22.1 0,00 - 0,90	
1,50	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig - Grundmoräne, Geschiebesand - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SU (Sand, schluffig)-SU* (Sand, stark schluffig)	hellbraun bis braun kalkfrei	schwach feucht	mäßig schwer zu bohren bis 'schwer zu bohren	bgp Pr. 22.2 0,90 - 1,50	
3,00	Feinsand, schwach mittelsandig bis mittelsandig - glazifluvial, Vorschüttbildung - Brandenburger Vorstoß Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft)	braun bis graubraun kalkfrei	schwach feucht	mäßig schwer zu bohren	bgp Pr. 22.3 1,50 - 3,00	

m u. GOK (45,14 m ü. NHN)

BS 22

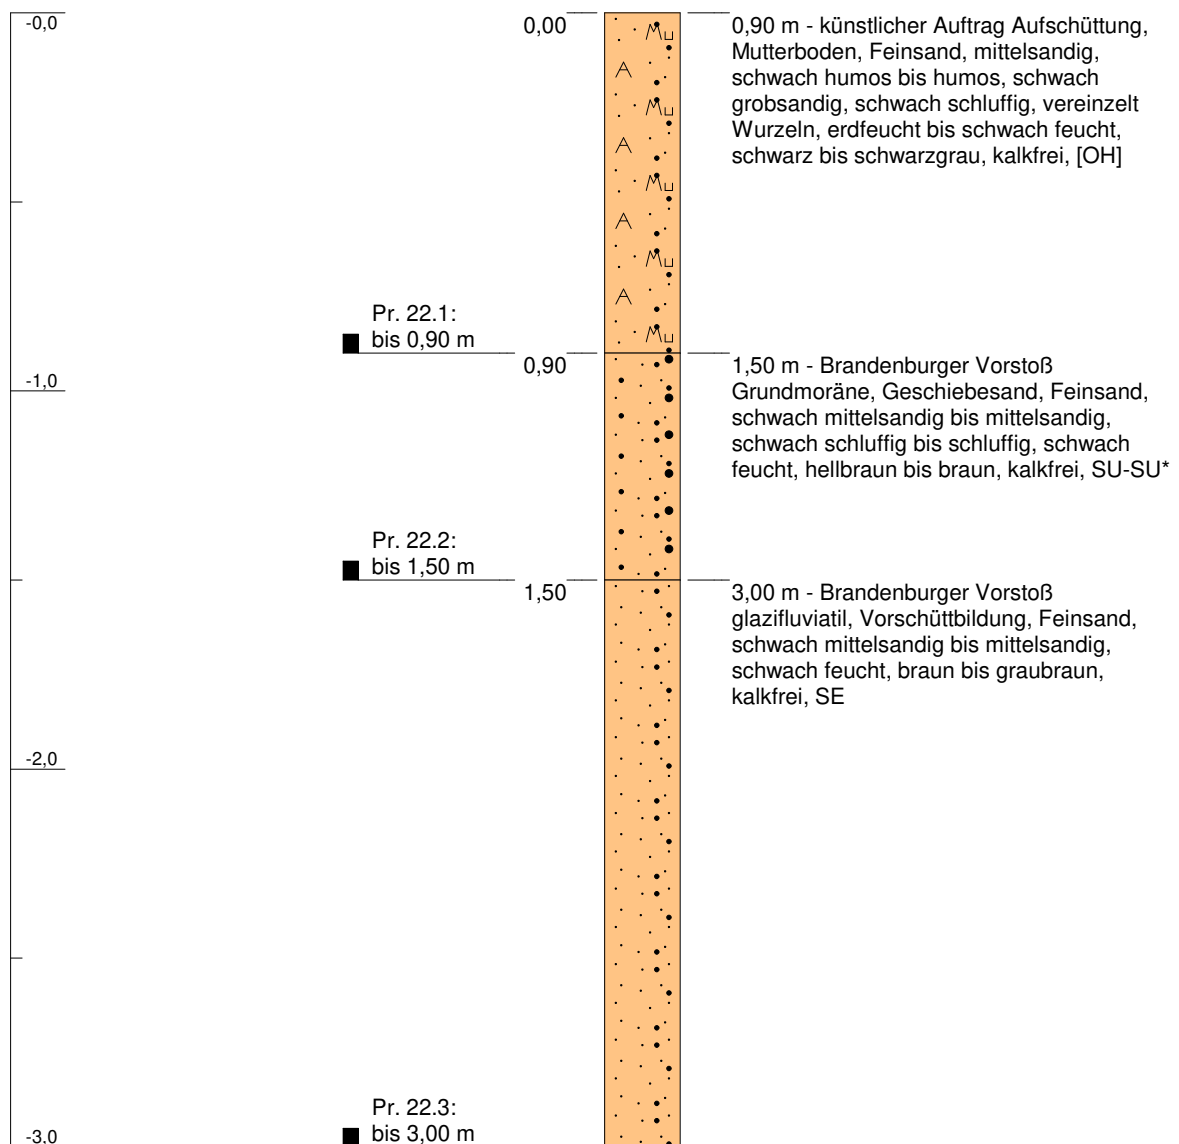

Höhenmaßstab: 1:20

Blatt 1 von 1

Projekt: B-Plan Neue Blumenstadt in 14959 Trebbin Baruther Straße 43 in 14959 Trebbin			
Bohrung: BS 22			
Auftraggeber: Trebbin Familienwohnprojekt GmbH Co. KG		Ostwert:	379693 mE
Bohrfirma: AnalyTech GmbH Mittenwalde		Nordwert:	5786367 mN
Bearbeiter: Frau Giese		Ansatzhöhe:	45,14 m ü. NHN
Datum: 24.03.2026	Anlage 2	Endtiefe:	3,0 m u. Ansatz

**AnalyTech**
BERLIN-BRANDENBURG
